



Akční plán pro řešení dopadů dostavby Jaderné elektrárny Dukovany

verze 1.2 - 23. 09. 2025



Obsah

1	Úvod	2
2	Vazba na Socioekonomickou studii	3
3	Proces tvorby akčního plánu	5
3.1	Akční plán	6
4	Přehled opatření a doporučení	8
4.1	Opatření na národní úrovni	8
4.1.1	Oblast bezpečnosti, integrace a krizového řízení	8
4.1.2	Oblast bydlení a veřejné infrastruktury	17
4.1.3	Oblast dopravy	22
4.1.4	Oblast podpory podnikání a trhu práce	26
4.1.5	Oblast školství a vzdělávání	30
4.1.6	Oblast zdravotnictví a sociálních služeb	33
4.1.7	Průřezové oblasti	38
4.2	Doporučení pro dotčené území	44
5	Implementační rámec	47
5.1	Organizační a řídicí struktura	47
5.2	Proces implementace	47
5.3	Řízení rizik	48
5.4	Financování	49
5.4.1	Rozpočtové náklady	49
5.4.2	Způsob provádění a financování akčního plánu	50
6	Přílohy	53
6.1	Přehled opatření	53
6.2	Seznam obrázků	55
6.3	Seznam tabulek	55
6.5	Seznam zkratk	56



1 Úvod

Výstavba nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany představuje jednu z klíčových investic strategického významu pro Českou republiku. Tento projekt přináší významné socioekonomické dopady na dotčené obce a regiony. Je proto nezbytné, aby jednotlivé projekty a opatření byly plánovány koordinovaně, systematicky a včas.

Socioekonomická studie Dukovany 2024 (dále jen „studie“), která analyzuje tyto dopady a definuje klíčové potřeby území, byla vzata na vědomí **vládou České republiky usnesením ze dne 15. ledna 2025 č. 29**. Tímto usnesením zároveň vláda ČR uložila ministru pro místní rozvoj předložit akční plán pro řešení územních dopadů dostavby Jaderné elektrárny Dukovany.

Akční plán pro řešení dopadů dostavby Jaderné elektrárny Dukovany (dále jen „akční plán“) představuje hlavní nástroj pro řízenou přípravu, podporu a realizaci projektů a opatření na úrovni státu, krajů a dotčených obcí. Jeho cílem je zajistit, aby výstavba a následný provoz nového jaderného zdroje přispěly k udržitelnému rozvoji území, zvýšení kvality života obyvatel a posílení odolnosti místní ekonomiky v dotčeném území.

Akční plán byl sestaven na základě jednání s dotčenými ministerstvy a dalšími zainteresovanými subjekty a reflektuje konkrétní potřeby dotčeného území, které vyplynuly v přímé souvislosti s přípravou dostavby Jaderné elektrárny Dukovany (EDU). Akční plán je zpracován na základě analytických výstupů studie a nových skutečností reflektujících aktuální stav dostavby EDU.

Akční plán:

- navazuje na schválenou studii,
- je východiskem pro řešení dopadů a využití příležitostí dostavby EDU,
- obsahuje konkrétní opatření a projekty tříděné podle gesční příslušnosti,
- reflektuje tematické priority vyplývající ze studie a potřeb dotčeného území (doprava, infrastruktura, vzdělávání, zdravotnictví aj.),
- zajišťuje řídicí rámec včetně financování, řízení rizik, pravidelného vyhodnocování a financování,
- je východiskem pro akční plány Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, přičemž vychází z potřeb dotčeného území.

Akční plán je dynamický dokument, který bude pravidelně aktualizován a doplňován v souladu s bodem 5.2. akčního plánu, a to na základě vývoje projektu dostavby EDU, dostupnosti finančních zdrojů a aktuálních potřeb území. Platnost akčního plánu je stanovena na období dostavby EDU, minimálně do roku 2038.

K datu zpracování akčního plánu nejsou k dispozici veškeré související informace potřebné pro jeho sestavení. Tyto informace budou postupně upřesňovány v návaznosti na uzavřenou smlouvu mezi společností Elektrárna Dukovany II, a. s. a společností Korea Hydro & Nuclear Power Co., LTD ze dne 16. června 2025.


Akční plán nezahrnuje oblasti podpory, které jsou řešeny usnesením vlády České republiky ze dne 4. června 2025 č. 402 o plnění a aktualizaci zajištění financování úprav dopravní infrastruktury v souvislosti s výstavbou nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany. Vybraná opatření akčního plánu mají vůči tomuto usnesení komplementární charakter a zaměřují se na oblasti, které jdou nad rámec tohoto usnesení a přímo souvisejí s řešením dopadů dostavby EDU.

2 Vazba na studii

Studie byla zadána Ministerstvem pro místní rozvoj (dále také „MMR“) ve spolupráci s Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem. Cílem studie bylo zmapování dopadů dostavby dvou bloků Jaderné elektrárny Dukovany na dotčené území, s cílem identifikovat pozitivní a negativní efekty této výstavby. Studie poskytuje doporučení pro veřejný sektor na minimalizaci negativních dopadů a využití příležitostí spojených s tímto projektem. Zpracování probíhalo v období od dubna do září 2024, do konce roku pak proběhly prezentace jejích výsledků.

Dopady jsou kvantifikovány na základě modelu sociodemografické projekce srovnáním socioekonomického vývoje s a bez vlivu dostavby EDU, využívající primární i sekundární data, terénní šetření a veřejné diskuse s místními aktéry dotčeného území. Pro analýzu dopadů dostavby EDU bylo definováno dotčené území zahrnující 10 správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Obrázek 1: Dotčené území pro účely vypracování studie

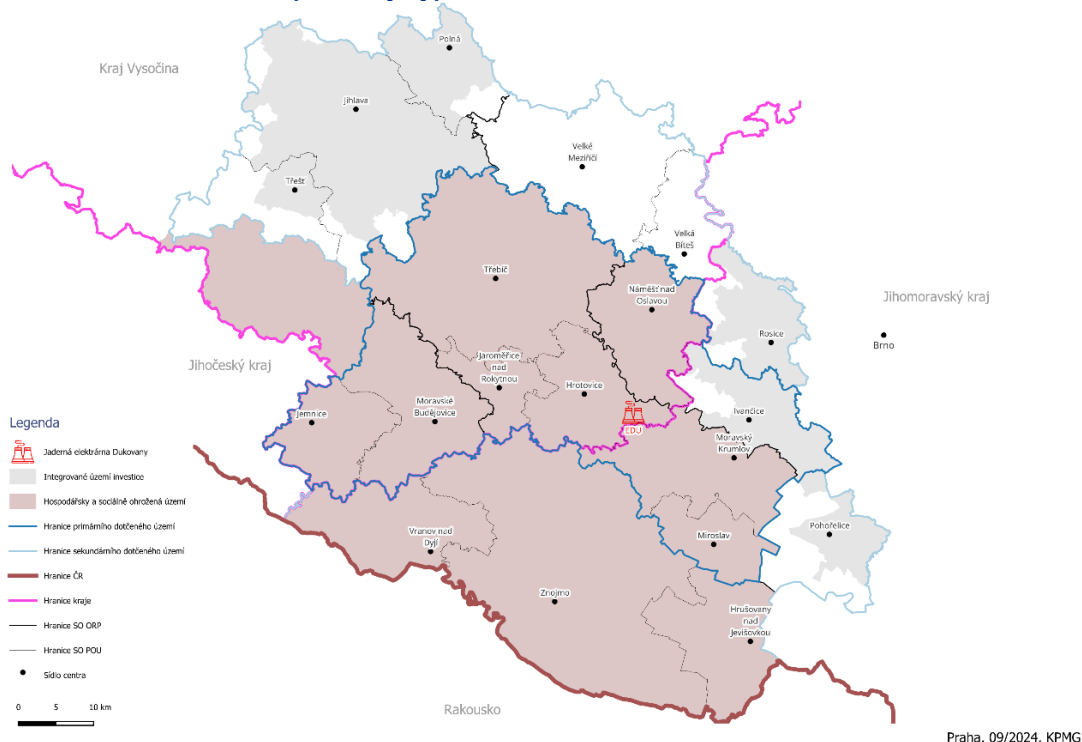

V rámci studie byly zhodnoceny jak socioekonomické změny v území, tak konkrétní dopady dostavby.

Klíčové pozitivní dopady	Klíčové negativní dopady
- Zvýšení HDP a HPH na národní úrovni, vznik a zintenzivnění subdodavatelských vztahů a iniciace daňových příjmů souvisejících s dostavbou - Posílení konkurenceschopnosti místní ekonomiky, zrychlení procesu zavádění inovací, digitalizace a automatizace - Zlepšení demografické situace – omezení dopadů vylidňování a stárnutí dotčeného území - Navýšení dodatečných daňových příjmů obcí v souvislosti s trvalým usídlením osob	- Zajištění veřejné infrastruktury pro osoby ubytované v hromadných ubytovacích zařízeních způsobí obcím finanční ztrátu - Nárůst nákladní dopravy a individuální automobilové dopravy přispěje k lokálnímu zhoršení plynulosti provozu a může prohloubit negativní socioekonomické dopady (např. poškození silnic, nárůst hluchosti, prašnosti a pocitu nebezpečí pro chodce) - Prohloubení nedostupnosti ambulantní lékařské péče oproti stávajícímu stavu - Zvýšení výdajů na podporu integrace cizinců

Klíčové pozitivní dopady	Klíčové negativní dopady
• Opatření realizovaná na krajské silniční infrastruktuře, která zkvalitní silniční komunikace v dotčeném území • Posílení konkurence na trhu práce a jeho odolnosti a zvýšení mzdové úrovně v lokální ekonomice • Příliv nových obyvatel zejména v mladém produktivním věku představuje příležitost pro rozvoj obcí a jejich veřejných služeb. • Nárůst mladé populace zmírní stárnutí populace a posílí trh práce • Akcelerace nové bytové výstavby v bytových a rodinných domech • Využití stávajících kapacit v hromadných ubytovacích zařízeních v dotčeném území	• Snížení vnímané úrovně bezpečnosti místními obyvateli v souvislosti s koncentrací nových obyvatel včetně cizinců • Prohloubení nedostatku vhodných absolventů zejména středních a vysokých škol • Hledání zaměstnanců mimo lokální ekonomiku – jinde v České republice či v zahraničí • Ztráta kvalifikovaných pracovníků ve veřejném sektoru a sektoru služeb, které nedokážou konkurovat mzdové úrovni v regionu • Přetěžování stávající veřejné infrastruktury zejména tam, kde bude realizována bytová výstavba nebo výstavba dočasného ubytování • Vytěsnění cestovního ruchu zejména v SO ORP s nízkou ubytovací kapacitou

Studie byla vypracována dle jednotlivých tematických oblastí, k nimž byly připraveny podrobné závěry. Přehled klíčových závěrů studie je uveden níže:

1. **Populační vývoj** – očekávaný příliv až 9 700 obyvatel v roce 2034, přičemž příliv pracovníků částečně kompenzuje stárnutí a vyřizování.
2. **Doprava** – dopad na dopravu v intravilánech měst, s nutností řešení obchvatů a zajištění kvalitního stavu hlavních dopravních tras. Podpora veřejné dopravy, rozvoj cyklistické infrastruktury a možnost využití železniční dopravy pro návoz materiálů.
3. **Zdravotnictví** – zdravotní péče je již v současné době hůře dostupná a očekává se, že dostavba EDU tento problém dále prohloubí. Nutnost posílení zdravotnické infrastruktury, včetně kapacit jak urgentní, lůžkové tak ambulantní lékařské péče.
4. **Krizové řízení** – potenciálně nižší dopad na integrovaný záchranný systém, avšak možné snížení vnímané bezpečnosti v oblastech s vyšší koncentrací cizinců, s čímž souvisí potřeba zlepšení vybavenosti a personální stabilizace složek IZS.
5. **Ubytování a bydlení** – potřeba výstavby téměř 3 000 nových bytů a rozšíření kapacit hromadného ubytování pro pracovníky, které chybí zejména v přímé okolí dostavby.
6. **Trh práce** – dostavba z důvodu nízké nezaměstnanosti dále prohloubí nedostatek pracovníků se zejména technickým vzděláním, povede k růstu mzdové úrovně, což bude ovlivňovat konkurenceschopnost vybraných odvětví.
7. **Školství** – kapacita vzdělávacích institucí je převážně dostatečná, ale je nutné přizpůsobit nabídku studijních oborů potřebám zaměstnavatelů.
8. **Podnikatelský sektor** – Potřeba podpory místních podniků a jejich integraci do subdodavatelských řetězců ve výši až 250 mld. Kč, což povede ke vzniku až 1 000 nových podnikatelských subjektů.
9. **Finanční příjmy obcí** – pozitivní dopad v podobě zvýšení daňových příjmů obcí o 1,5 mld. Kč v důsledku trvalého usídlení nových obyvatel, negativní dopad pak představuje ztráta příjmů z osob s dočasným pobytem.

Studie dále identifikovala některé klíčové závěry, na které musí akční plán reagovat:

- Nedostatečná a rozdílná informovanost aktérů o dostavbě EDU, přičemž mimo území Energo-regionu je informovanost podstatně nižší.
- Pozitivní dopady dostavby EDU převažují, ale časový nesoulad mezi okamžitými negativními a pozdějšími pozitivními dopady vyžaduje včasnou podporu a alokaci zdrojů.
- Dopady dostavby jsou lokální, některé obce mohou těžit z nárůstu populace a ekonomických stimulů, jiné budou čelit negativním důsledkům. Podpora proto musí reagovat na specifické potřeby těchto obcí.

3 Proces tvorby akčního plánu

Za účelem koordinace zpracování akčního plánu Ministerstvo pro místní rozvoj vyzvalo v souladu s usnesením vlády resorty k nominaci zástupce, který bude za daný resort k dispozici pro potřeby přípravy akčního plánu:


- Ministerstvo vnitra
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Ministerstvo dopravy
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- Ministerstvo obrany
- Ministerstvo financí

Všechny resorty pro potřeby zpracování nominovali svého zástupce, vyjma Ministerstva financí. S ohledem na zaměření akčního plánu dále Ministerstvo pro místní rozvoj do tohoto procesu přizvalo následující resorty, které nominovaly svého zástupce:

- Ministerstvo zemědělství
- Ministerstvo životního prostředí

Výsledkem bylo vytvoření **dočasných pracovní skupin**, jejímž cílem bylo připravit vstupní verzi akčního plánu k předložení vládě ČR. Akční plán byl vytvořen na základě jednání této pracovní skupiny a bilaterálních jednání se zástupci těchto resortů. Podkladem pro jednání byly výstupy ze studie, nové skutečnosti známé k datu zpracování akčního plánu a podněty z dotčeného území a informace z jednání na úrovni Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, které připravují své vlastní akční plány na regionální úrovni.

Způsob zpracování akčního plánu naznačuje níže uvedené schéma.

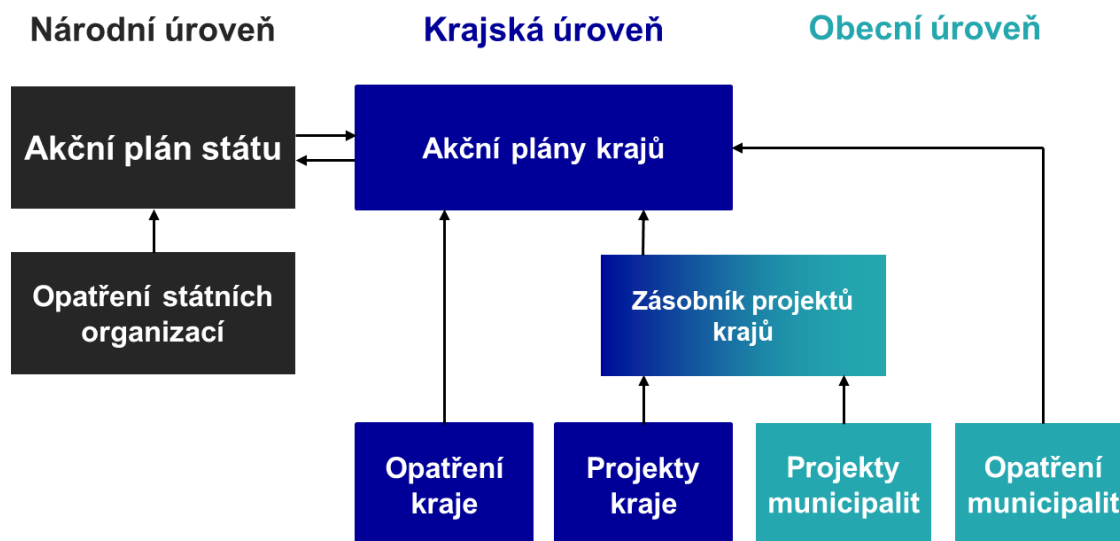

3.1 Akční plán

Akční plán se skládá z jednotlivých opatření, která jsou v něm seřazena dle gesce a témat vycházejících ze studie.

Členění opatření podle gesce

Členění podle gesce umožňuje jednoznačně rozlišit, která úroveň veřejné správy má nést odpovědnost za přípravu a realizaci jednotlivých opatření.

- **Opatření na národní úrovni** – opatření, která vyžadují soustředěnou podporu ze strany státu ve vztahu k dotčenému území, a to zejména ze strany ministerstev a dalších centrálních institucí.
- **Doporučení pro dotčené území** – návrhy opatření, která jsou doporučena k realizaci Kraji Vysočina a Jihomoravskému kraji, dotčeným obcím a dalším aktérům.

Členění opatření dle tématu

Členění je provedeno dle témat, která byla pro potřeby akčního plánu agregována pro zvýšení srozumitelnosti a orientace.

- **Oblast bezpečnosti, integrace a krizového řízení**
Tato oblast se zaměřuje na posílení kapacit pro zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti obyvatel a efektivního zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací. Součástí je také podpora sociální soudržnosti a integrace nově přichozích pracovníků v souvislosti s dostavbou EDU.
- **Oblast bydlení a veřejné infrastruktury**
Opatření v této oblasti reagují na zvýšené nároky na bytový fond a veřejnou infrastrukturu v dotčeném území. Cílem je zajistit dostupné bydlení a odpovídající technickou i občanskou vybavenost.
- **Oblast dopravy**
Tato oblast se zaměřuje na rozvoj dopravní infrastruktury a posílení veřejné dopravy, které je hlavním předpokladem zvládnutí zvýšené dopravní zátěže v souvislosti s výstavbou EDU. Tato oblast se zaměřuje na bezpečnost, kapacitu a udržitelnost dopravního systému.
- **Oblast podpory podnikání a trhu práce**
Tato oblast se zaměřuje na využití ekonomického potenciálu spojeného s dostavbou EDU prostřednictvím podpory investic, inovací a fungujícího trhu práce. Opatření směřují k vytvoření inovačního a investičního zázemí v území, zajištění kvalifikované pracovní síly formou cílených nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, řízené ekonomické migrace a posílení kontrolních kapacit inspekce práce. Cílem je využít dostavbu EDU ke zvýšení atraktivity dotčeného území pro podnikání, udržet kvalifikované pracovníky a posílit dlouhodobou hospodářskou odolnost území.
- **Oblast školství a vzdělávání**
Oblast reaguje na specifické požadavky spojené s dostavbou EDU prostřednictvím cílené podpory vysokého školství v jaderných a technických oborech, úprav oborové struktury regionálního školství dle potřeb trhu práce a rozvoje vzdělávací infrastruktury v dotčeném území. Cílem je zajistit odpovídající kapacity a kvalifikaci lidských zdrojů nezbytných pro dostavbu EDU i ekonomiku dotčeného území.



- Oblast zdravotnictví a sociálních služeb

Tato oblast se zaměřuje na posílení zdravotnického systému a sociálních služeb v souvislosti s dostavbou EDU. Cílem je zajistit dostatečnou krizovou připravenost, kapacitu nemocnic, dostupnost zdravotní péče a modernizaci infrastruktury v dotčeném území. Opatření reagují na očekávané zvýšení zátěže zdravotnictví a potřebu koordinovaného přístupu všech klíčových aktérů.

- Průřezové oblasti

Tato oblast se zaměřuje na opatření, která mají napříč celým procesem přípravy a realizace dostavby EDU zajistit předvídatelné, koordinované a odpovědné působení státu a dalších klíčových aktérů v dotčeném území. Součástí je strategická komunikace, odpovědný přístup investora, legislativní a metodické limity územního rozvoje i možné dopady surovinové politiky.

Jednotlivá opatření jsou zpracována ve formě strukturovaných karet. Tato forma zajišťuje přehlednost, srovnatelnost a efektivní řízení jejich realizace.

Tabulka 1: Vzor karty opatření

Tabulka 1: Vzor karty opatření			
Opatření č.			
Zdůvodnění relevance			
Zodpovědnost / garant			
Spolupráce			
Termín	Od:	Do:	
Výstupy			
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)			

4 Přehled opatření a doporučení

Akční plán zahrnuje soubor opatření, která vycházejí z objektivizovaných požadavků dotčeného území. Tyto požadavky byly identifikovány na základě transparentního procesu komunikace s dotčeným územím v souvislosti s dostavbou EDU a projednány v příslušných platformách.

4.1 Opatření na národní úrovni

Opatření v gesci ústředních orgánů státní správy, která vyžadují soustředěnou podporu ze strany státu ve vztahu k dotčenému území, a to zejména ze strany ministerstev a dalších centrálních institucí.

4.1.1 Oblast bezpečnosti, integrace a krizového řízení

1. Posílení personálních kapacit Hasičského záchranného sboru v souvislosti s dostavbou EDU			
Zdůvodnění relevance	V souvislosti s dostavbou EDU se předpokládá nárůst počtu událostí vyžadujících zásah složek hasičského záchranného sboru. Zvýšený pohyb těžké techniky a pracovníků, manipulace s technologiemi a materiály, provoz stavebních zařízení, stejně jako zátěž dopravní infrastruktury v dotčeném území, zvyšují pravděpodobnost vzniku požárů, dopravních nehod, technických havárií a úniků nebezpečných látek. Pro potřeby zajištění odpovídající reakční doby a rozsahu zásahů v rámci stanovených dojezdových časů a kapacit, je nezbytné posílení početních stavů příslušníků HZS na vybraných hasičských stanicích (HS) v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina, ale také zajištění odpovídajícího zázemí (viz opatření č. 3.). Pro zajištění potřebné akceschopnosti je nutné ve vybraných HS také přistoupit k úpravě jejich předurčenosti. Důležitou součástí opatření je také podpora skutečného obsazení systemizovaných pozic HS. Za tím účelem je vhodné ve spolupráci s dotčenými obcemi řešit zejména bytové potřeby příslušníků HZS.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo vnitra		
Spolupráce	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ministerstvo pro místní rozvoj Dotčené obce Společenství obcí		
Termín	01/2027	12/2038	
Výstupy	• Personální navýšení HZS JMK a HZS Kraj Vysočina • Změna typu dotčených hasičských stanic		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Navýšení systemizovaných míst na GŘ HZS ČR a vybraných HS v dotčeném území	MV, GŘ HZS ČR	01/2027
	Provedení změny typu vybraných HS v dotčeném území	MV, GŘ HZS ČR	01/2027



	Zajištění financování a personální obsazení HS	GR HZS ČR, HZS JMK, HZS KV	od 12/2027
	Zprostředkování dostupného bydlení pro příslušníky HZS	MMR, dotčené obce	Průběžně
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Počet systemizovaných pozic na GR HZS ČR + 2 pozice na odboru ochrany obyvatelstva + 2 pozice na odboru prevence Počet systemizovaných pozic dle jednotlivých HS - Hrotovice +9 pozic - Náměšť nad Oslavou +9 pozic - Rosice +3 pozice - Moravský Krumlov +9 pozic Počet personálních pozic na úseku ochrany obyvatelstva a prevence - HZS VYS +2 pozice - HZS JHM +3 pozice Změna typu HS: - Hrotovice – z P1 na P2 - Náměšť nad Oslavou – z P1 na P2 - Rosice – z P2 na P3 - Moravský Krumlov – z P1 na P2 Celkový odhad ročních nákladů na příslušníky: 42 mil. Kč. Celkový odhad nákladů na dobu dostavby: 432 mil. Kč.		

2. Posílení personálních kapacit Policie ČR v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	V souvislosti s dostavbou EDU se očekává zvýšená zátěž na veřejný pořádek a bezpečnost v dotčených regionech. Zvýšený pohyb osob a dopravních prostředků, včetně přepravy technologií a materiálů, může vést k vyššímu počtu dopravních přestupků a nehod. Navíc větší koncentrace osob ve vybraných lokalitách dotčeného území bude zvyšovat riziko výskytu přestupků a trestné činnosti. Pro zachování akceschopnosti a schopnosti efektivního zásahu je nezbytné posílení personálních kapacit Policie ČR v dotčených lokalitách v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. To zahrnuje nejen navýšení počtu sloužících policistů, ale také zajištění odpovídajícího zázemí (viz opatření č. 3.). Důležitou součástí opatření je také podpora skutečného obsazení systemizovaných pozic jednotlivých oddělení. Za tím účelem je vhodné ve spolupráci s dotčenými obcemi řešit zejména bytové potřeby příslušníků policie.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo vnitra		
Spolupráce	Policie České republiky Krajské ředitelství policie kraje Vysočina Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Ministerstvo pro místní rozvoj Dotčené obce Společenství obcí		
Termín	01/2027	12/2036	
Výstupy	- Personální navýšení KŘP JMK, KŘP kraje Vysočina - Posílení akceschopnosti Policie ČR v dotčeném území		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín



	Navýšení systemizovaných míst na nových a stávajících obvodních odděleních v dotčeném území	MV, Policie ČR	od 01/2027
	Zajištění financování a personálního obsazení nových a stávajících obvodních odděleních	MV, KŘP Jihomoravského kraje, KŘP kraje Vysočina	od 01/2027
	Zprostředkování dostupného bydlení pro příslušníky policie	MMR, dotčené obce	od 01/2027
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Počet systemizovaných pozic KŘP Jihomoravského kraje • Stávající obvodní oddělení Moravský Krumlov, ÚO Znojmo + 10 • Stávající obvodní oddělení Ivančice, ÚO Brno-venkov + 10 Celkový odhad ročních nákladů po dosažení cílového stavu: 18 mil. Kč mzdové náklady a 3 mil. Kč provozní náklady na 20 policistů. Celkový odhad nákladů po dobu dostavby (do r. 2036): 197 mil. Kč mzdové náklady a 35 mil. Kč provozní náklady. Počet systemizovaných pozic KŘP kraje Vysočina • Stávající Speciální jednotka Dukovany + 54 • Stávající Krajské ředitelství policie kraje Vysočina + 16" • Stávající Územní odbor policie Třebíč + 1 • Nové integrované obvodní oddělení Dukovany + 54 Celkový odhad ročních nákladů po dosažení cílového stavu: 106 mil. Kč mzdové náklady a 18 mil. Kč provozní náklady na 121 policistů a 4 občanské zaměstnance. Celkový odhad nákladů po dobu dostavby (do r. 2036): 930 mil. Kč mzdové náklady a 178 mil. Kč provozní náklady.		

3. Posílení infrastruktury a vybavení složek IZS v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU přinese výrazný nárůst stavebních, technologických a bezpečnostních činností v dotčeném území, což zvýší riziko mimořádných událostí vyžadujících rychlý a efektivní zásah složek integrovaného záchranného systému (IZS). Ze studie vyplývá, že současná kapacita IZS je v dotčeném území dostatečná pro běžné provozní situace, avšak není adekvátní pro zvládání specifických rizik a zvýšené zátěže, které souvisejí s dostavbou EDU, jako je zvýšený pohyb osob a techniky, dopravní problémy, koncentrace osob, případné environmentální hrozby nebo jiné mimořádné události či krizové situace. Za tímto účelem je potřebné v dotčeném území zvýšit technickou infrastrukturu základních, příp. ostatních složek IZS (zejména sborů dobrovolných hasičů) a jejich technické vybavení, tak, aby bylo možné rychle, efektivně a koordinovaně reagovat na mimořádné události související s dostavbou EDU. Konkrétně se jedná například o výstavbu nových stanic IZS – Hrotovice, Náměšť n/Oslavou, Skryje n/Jihlavou atd.; modernizace a rozšíření stávajících zázemí IZS – Moravský
-----------------------------	---



	Krumlov; pořízení a obměna vozidel; instalace a rozšíření kamerových systémů; zlepšení radiového spojení; zařízení ke zvýšení krizové připravenosti území; doplnění technických prostředků pro zásahy; zajištění a obměna zdravotnické techniky a vybavení, vybavení nových příslušníků výstrojním a výzbrojním majetkem, balistickou ochranou jednotlivce. dekontaminační místa, plochy atd.). Toto opatření je klíčové pro zabezpečení bezpečnosti obyvatel a provozních zařízení v dotčeném území a minimalizaci možných rizik.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo vnitra		
Spolupráce	Ministerstvo vnitra Složky integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany, Policie České republiky, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby) Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj Dotčené obce Společenství obcí		
Termín	01/2026	12/2032	
Výstupy	• Modernizovaná a rozšířená infrastruktura IZS • Doplněný vozový park a technické vybavení • Zlepšená připravenost a kapacita složek IZS pro zvládání mimořádných událostí		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Ověření potřeb území	MV, kraje, obce, IZS	do 06/2026
	Příprava programu (dot. titulu)	MV, kraje, IZS	do 12/2026
	Vyhlášení výzvy	MV	01/2027
	Realizace programu	MV	do 12/2032
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Rozpočet pro zajištění výstavby, modernizace a vybavení složek IZS • Hasičský záchranný sbor ○ Výstavba a rekonstrukce stanic HZS ČR - 430 mil. Kč ○ Prostředky a technika stanic HZS ČR - 200 mil. Kč ○ Podpora modernizace zázemí a vybavení jednotek SDH obcí v zóně HP - 200 mil. Kč • Policie ČR ○ Výstavba 20 bytů v lokalitě Moravský Krumlov a Ivančice o dispozici 3 + KK (cca 72 m²) - 140 mil. Kč ○ Vybudování zázemí pro speciální jednotku Dukovany – bude vybudováno ze strany ČEZ ○ Výstavba objektu nového integrovaného obvodního oddělení Dukovany - 400 mil. Kč ○ Vybavení movitým majetkem a zajištění dalšího vybavení (SDP, výstroj, výzbroj atp.) – 158 mil. Kč • Zdravotnická záchranná služba 150 mil. Kč • Ostatní potřeby (obce) 150 mil. Kč		

4. Kapacitní posílení regionálních pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU a s ní spojené rozvojové projekty budou znamenat významný nárůst počtu zahraničních pracovníků, včetně osob ze
-----------------------------	---



	třetích zemí, kteří budou do regionu přicházet za prací. Tento příliv pracovní síly bude mít zásadní dopad na činnost správních úřadů zajišťujících pobytovou agendu cizinců, zejména na regionální pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra v Jihlavě a Brně. Podle dopadové studie se očekává, že v roce 2034 bude v regionu současně pobývat přes 3 600 zahraničních pracovníků včetně jejich rodinných příslušníků. V průběhu celé realizace projektu, při zohlednění jejich fluktuace, může celkový počet dosáhnout až 22 000 osob. Tito cizinci budou pocházet z různých zemí a budou vyžadovat různé úrovně podpory v oblasti pobytové a integrační agendy. To klade vysoké nároky na kapacitu a flexibilitu příslušných správních činností zajišťovaných Ministerstvem vnitra. Cílem opatření je personální posílení a rozšíření kapacit regionálních pracovišť odboru azylové a migrační politiky, oddělení pobytu cizinců, Ministerstva vnitra v Jihlavě a Brně. Vzhledem k očekávanému výraznému nárůstu agendy spojené s pobytem cizinců během dostavby EDU a souvisejících projektů je nezbytné, aby tyto úřady disponovaly dostatečnými kapacitami k efektivnímu zajištění pobytových záležitostí zahraničních pracovníků. Bez tohoto opatření nebude možné zajistit plynulé vyřizování žádostí, správní řízení ani celkovou podporu při příjezdu a pobytu zahraničních pracovníků na území ČR. To by mohlo negativně ovlivnit nejen samotnou realizaci projektu, ale i celkový sociální a správní chod v dotčeném regionu.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo vnitra		
Spolupráce	Kraj Vysočina (CPIC Kraj Vysočina) Jihomoravský kraj (Centrum pro cizince Jihomoravského kraje)		
Termín	Od 01/2026Do 12/2038		
Výstupy	Zajištění personální kapacity regionálních pracovišť odboru azylové a migrační politiky MV		
Plánované aktivity	Popis	Díleč z odpvďdnost	Indikativní termín
	Posílení regionálních pracovišť MV (předpokládané navýšení počtu systemizovaných míst na vybraných pracovištích odboru azylové a migrační politiky o 10 služebních míst)	MV	01/2027
	Zajištění správních činností v oblasti pobytové agendy	MV	do 12/2038
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad rozpočtu: cca 15 mil. Kč ročně (celkem 180 mil. Kč).		

5. Posílení kapacit center na podporu integrace cizinců v území dotčeném dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU a související rozvojové projekty v území budou vyžadovat zahraniční pracovníky včetně pracovníků ze třetích zemí, což klade důraz na jejich efektivní integraci v rámci dotčeného území. Zároveň je integraci nutné vnímat jako dvoustranný proces v němž hraje roli i majoritní společnost, která také musí být cílovou skupinou prointegračních aktivit.
-----------------------------	---



	Dle studie se zde bude nejvíce najednou pohybovat přes 3 600 zahraničních pracovníků a jejich rodinných příslušníků v roce 2034. Za celou dobu dostavby a při zohlednění jejich fluktuace však může tento počet dosáhnout přibližně 22 tis. cizinců. Tento počet bude tvořit spektrum cizinců s různými požadavky na integraci v území. Aby byla tato integrace efektivní, je nutné vytvořit flexibilní infrastrukturu, která bude schopna reagovat na různé etapy přílivu pracovníků. Cílem opatření je zejména personální, organizační a finanční posílení činnosti k tomu určených pracovišť v území, a to Centra na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina (CPIC Kraj Vysočina) v Jihlavě a Centra pro cizince Jihomoravského kraje v Brně, a jejich přítomnosti v dotčeném území. Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou známy lokality pro ubytování cizinců podílejících se na stavbě, není možné určit lokaci detašovaného pracoviště. Pro zřízení detašovaného pracoviště, případně pracovišť je nutné přihlídnout ke vzdálenosti od takového místa, aby byla jeho činnost co nejefektivnější. Vhodný výběr pro umístění detašovaného pracoviště je proto nutné koordinovat se společností Elektrárna Dukovany II, a. s. a dotčenými kraji.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo vnitra		
Spolupráce	Kraj Vysočina (CPIC Kraj Vysočina) Jihomoravský kraj (Centrum pro cizince Jihomoravského kraje) Ministerstvo průmyslu a obchodu (Elektrárna Dukovany II, a. s.)		
Termín	01/2026	12/2038	
Výstupy	• Posílení kapacity center na podporu integrace cizinců v KV a JMK • Nově vytvořené detašované pracoviště		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Posílení činnosti CPIC Kraj Vysočina (předpokládané navýšení počtu pracovních míst Správy uprchlických zařízení MV ČR, která je zřizovatelem CPIC Kraj Vysočina o 3 pracovní místa)	MV, KV (CPIC Kraj Vysočina)	1/2027
	Posílení činnosti Centra pro cizince Jihomoravského kraje	MV, JMK (Centrum pro cizince Jihomoravského kraje)	1/2027
	Zřízení detašovaného pracoviště/pracovišť	MV (CPIC Kraj Vysočina)	12/2027
	Zajištění činností regionálních center na podporu integrace cizinců v KV a JMK	CPIC Kraj Vysočina, Centrum pro cizince Jihomoravského kraje	do 12/2038
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad rozpočtu: • CPIC Kraj Vysočina - 5 mil. Kč ročně (60 mil. Kč) • Centrum pro cizince Jihomoravského kraje – 5 mil. Kč ročně (60 mil. Kč)		



6. Posílení krizové připravenosti území v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU představuje rozsáhlý infrastrukturní projekt, který významně ovlivní bezpečnostní situaci v dotčených regionech. Zvýšený pohyb osob a techniky, nárůst dopravní zátěže a koncentrace pracovníků na staveništi zvyšují pravděpodobnost vzniku mimořádných událostí, jako jsou dopravní nehody, technické havárie či úniky nebezpečných látek. Pro zajištění efektivní reakce na tyto potenciální hrozby je nezbytné posílit krizovou připravenost území prostřednictvím aktualizace plánovací dokumentace pro oblast havarijního a krizového plánování, provádění pravidelných cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) a koordinace postupů mezi jednotlivými složkami IZS.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo vnitra		
Spolupráce	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Policie ČR Ministerstvo obrany (Armáda ČR) Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Obce s rozšířenou působností v dotčeném území Zdravotnická záchranná služba Elektrárna Dukovany II, a. s.		
Termín	01/2026	12/2036	
Výstupy	- Aktualizovaná plánovací dokumentace pro oblast havarijního a krizového plánování krajů a obcí - Provedení pravidelných taktických a prověřovacích cvičení složek IZS - Zvýšená připravenost složek IZS na řešení mimořádných událostí v souvislosti s dostavbou EDU		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Revize a aktualizace krizových plánů na úrovni krajů a obcí	Kraj Vysočina Jihomoravský kraj, SO ORP obce	12/2027
	Organizace a provedení taktických a prověřovacích cvičení složek IZS	HZS ČR, Policie ČR, ZZS, EDU II	Průběžně
	Koordinace postupů a komunikace mezi složkami IZS	MV, MO, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, složky IZS, EDU II	Průběžně
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad rozpočtu na revizi a aktualizaci plánovací dokumentace pro oblast havarijního a krizového plánování, na cvičení složek IZS a související měkké aktivity– cca 50 mil. Kč		

7. Vytvoření zvláštního vládního programu na podporu cílené ekonomické migrace pro účely dostavby EDU

Zdůvodnění relevance	Projekt dostavby EDU bude vyžadovat nábor pracovníků v technických a dělnických profesích, u nichž český trh práce čelí dlouhodobému nedostatku. V ČR již fungují programy řízené migrace, které jsou určeny pro doplnění specifických potřeb českého trhu. Vzhledem k specifickým potřebám stran profilu pracovníků v různých etapách dostavby by měl být navržen vlastní program pro potřeby dostavby s vlastními kvótami. Bez
-----------------------------	---



	samostatného programu hrozí, že dostavba EDU pohltí převážnou část kapacit stávajících migračních programů, což by zásadně omezilo dostupnost zahraničních pracovníků pro ostatní zaměstnavatele v ČR. Inspirací mohou být existující programy ekonomické migrace, které byly navrženy s ohledem na konkrétní požadavky vybraných odvětví a specifický profil uchazečů z konkrétních zemí. Pro dostavbu Dukovan je třeba obdobně zmapovat požadavky na profesní a kapacitní profil pracovníků a nastavit parametry programu tak, aby odpovídaly těmto potřebám. Současně je nezbytné při nastavování podmínek programu zohlednit nejen potřeby zaměstnavatelů, ale také integrační potřeby a standardy samotných zahraničních pracovníků. Program musí obsahovat opatření zajišťující důstojné a spravedlivé mzdové a pracovní podmínky, přístup k informační a integrační podpoře a obecně nesmí opomenout integrační dimenzi náboru pracovní síly ze zahraničí, která je klíčová pro dlouhodobou udržitelnost a společenskou akceptaci projektu Specifický migrační program bude klíčovým nástrojem pro zajištění řádné evidence pracovníků a kontrolování jejich pracovního statusu na území ČR, čímž se zajistí efektivní řízení migrace a transparentnost celého procesu a sníží se riziko využívání alternativních mechanismů vstupu na trh práce, které se mohou vymýkat kontrole českých institucí. Program bude reflektovat potřeby investora i regionu. Zároveň je potřeba v rámci návrhu programu nastavit vyvážené řešení, které umožní realizaci migračního záměru v souladu s potřebami projektu a zároveň respektuje oprávněné zájmy dotčených obcí.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo průmyslu a obchodu		
Spolupráce	Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Elektrárna Dukovany II, a. s.		
Termín	01/2026	12/2036	
Výstupy	Vládou schválený program cílené ekonomické migrace pro projekt Dukovany		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Vyhodnocení očekávané poptávky, potřebných kvót a cílových zemí včetně profilů pracovníků	MPSV, MPO, MV, MZV, EDU II	03/2026 a průběžně dle upřesňování poptávky
	Návrh a schválení programu cílené ekonomické migrace	MPO, MPSV, MV, MZV	06/2026
	Posílení kapacit zastupitelských úřadů v cílových zemích	MZV	01/2027
	Realizace programu	MPSV, MPO, MV, MZV, EDU II	do 12/2036
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Aktivní spolupráce ze strany investora a participujících dodavatelů, pokud jde o upřesnění očekávané poptávky a specifikaci zdrojových zemí.		



	Odhad požadavku na státní rozpočet potřebný pro vytvoření a implementaci programu bude upřesněn. Posílení kapacity MPO za účelem implementace programu po dobu jeho realizace. Posílení kapacit na zastupitelských úřadech v cílových zemích; zajištění dostatečných kapacit pro výkon cizinecké pobytové agendy. Migrační program bude v souladu s dlouhodobě uplatňovanými principy při zacílení české imigrační politiky s ohledem na státy původu zahraničních pracovníků a s důrazem na prevenci migračních, bezpečnostních a integračních rizik.
--	--

8. Podpora bezpečnosti a prevence kriminality v obcích v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dlouhodobé zkušenosti MV s bezpečnostní situací v okolí průmyslových zón (PZ) v ČR v rámci činnosti Pracovní skupiny pro řešení problémů spojených se zaměstnáváním cizinců (zřízena na základě usnesení vlády ČR č. 388 ze dne 22. 5. 2017) jsou takové, že s přílivem zahraničních pracovníků do jednotlivých lokalit v blízkosti průmyslových zón často dochází k nárůstům kriminality (což potvrzují statistiky Policie ČR a statistiky přestupkových jednání od obcí), a především ke zhoršení subjektivního pocitu bezpečí občanů. Podle dopadové studie se očekává, že v dotčeném regionu budou tisíce zahraničních pracovníků, což s sebou nese zvýšené riziko kriminality a dalšího rizikového chování. Významným kriminogenním faktorem v okolí PZ v ČR (lze v budoucnu vztahovat i na okolí EDU) je skutečnost, že zde pracuje (je ubytováno, tráví zde volný čas atd.) velká část cizinců, jenž má zaměstnání zprostředkované často přes agentury práce, nemají zde rodinné zázemí a pevné vazby. Jedná se zpravidla o „levnou“ pracovní sílu, s nižší kvalifikací a vzděláním. Životní návyky, způsob trávení volného času atd. těchto cizinců jsou často zcela odlišné od toho, na co je většinová společnost v ČR zvyklá a co očekává, což ve spojitosti s jazykovou bariérou často vyvolává konflikty s místními obyvateli. Zvýšený počet pracovníků, kteří nemají úzký vztah k dané lokalitě, se ale nemusí týkat pouze cizinců. Může se týkat i zaměstnanců z jiných, většinou vzdálenějších oblastí ČR. I jejich přítomnost může mít některé negativní dopady typické pro zaměstnávání cizinců a preventivní opatření tak z tohoto pohledu musí být obecnější. Výše uvedené rizikové a kriminogenní faktory je možné zmírnit a předcházet jejich negativním dopadům, a rovněž zajistit, aby nebyl snížen subjektivní pocit bezpečí občanů zde dlouhodobě žijících. Lze tak dosáhnout realizací osvědčených aktivit a opatření z oblasti prevence kriminality uvedených ve Strategii prevence kriminality ČR na léta 2022–2027 (schválena usnesením č. 276 ze dne 6. dubna 2022, ve znění pozdějších usnesení vlády ČR). Mezi osvědčené a dlouhodobě realizované projekty prevence kriminality na místní úrovni patří projekt Asistent prevence kriminality, Domovník – preventista, Bezpečnostní dobrovolník, kamerové systémy (včetně mobilních kamer), zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, hardware nebo software pro bezpečnostní účely, osvětlení rizikových míst apod.
-----------------------------	--



	Příkladem úspěšného zvládnutí zmíněných negativních dopadů může být např. v letech 2017 až 2020 MV realizovaný Program 314 100 „Podpora bezpečnosti v obcích v souvislosti s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny-Rychnov nad Kněžnou“ (schválen usnesení vlády ČR ze dne 21. června 2017 č. 469), který výrazně přispěl ke stabilizaci bezpečnostní situace v PZ Kvasiny.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo vnitra		
Spolupráce	Policie České republiky Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Dotčené obce Společenství obcí		
Termín	1/2026	12/2038	
Výstupy	Program na podporu bezpečnosti a prevence kriminality pro obce dotčené dostavbou EDU		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Vyhodnocení očekávaných potřeb v dotčeném území	MV, Policie ČR, JMK a Kraj Vysočina, dotčené obce	3/2027
	Příprava a schválení dotačního programu	MV	12/2027
	Realizace programu	MV, JMK a Kraj Vysočina, dotčené obce	od 1/2028
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Finanční prostředky zajištěné v rámci navýšení rozpočtu MV ze státního rozpočtu (nad rámec aktuálně schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu). Odhad požadavku na státní rozpočet potřebný pro vytvoření a implementaci programu bude upřesněn ve spolupráci s Krajem Vysočina, Jihomoravským krajem, dotčenými obcemi a Policií ČR.		

4.1.2 Oblast bydlení a veřejné infrastruktury

9. Podpora výstavby a rekonstrukce dostupného nájemního bydlení v území dotčeném dostavbou EDU	
Zdůvodnění relevance	V dotčeném území dostavby EDU byla na základě dopadové studie byla identifikována potřeba výstavby přibližně 3 000 bytů, přičemž přibližně 20 % tohoto objemu by mělo být řešeno formou dostupného nájemního bydlení. Důvodem je nezbytnost zajištění bydlení nejen pro vybrané osoby podílející se na dostavbě EDU, ale zejména pro klíčové profese, jejichž přítomnost je v území zásadní pro zachování funkčních veřejných služeb (např. zdravotníci, příslušníci bezpečnostních složek, pracovníci v oblasti sociálních služeb). Uvedené profesní skupiny budou negativně ovlivněny z hlediska konkurence na trhu práce v důsledku odlivu pracovní síly do EDU.



	Opatření je klíčové také pro včasné zajištění bytových kapacit v návaznosti na očekávaný rozvoj území. Podpora dostupného nájemního bydlení umožní reagovat na očekávanou poptávku nové populace, což přispěje k jejímu usazení v tomto území.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo pro místní rozvoj		
Spolupráce	Státní fond podpory investic Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Dotčené obce Společenství obcí		
Termín	01/2026	12/2036	
Výstupy	- Úvěrový program na podporu dostupného nájemního bydlení v území - Vybudování minimálně 600 bytů v režimu dostupného nájemního bydlení		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Ověření absorpční kapacity území (potřeby, možnosti, územní limity)	MMR, JMK, Kraj Vysočina, dotčené obce a SFPI	06/2026
	Příprava výzvy	MMR, SFPI	do 12/2026
	Vyhlášení výzvy	MMR, SFPI	01/2027
	Realizace programu	MMR, SFPI	do 12/2036
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad rozpočtu na program: 2 mld. Kč. Dostatečná absorpční kapacita vhodných projektů.		

10. Podpora výstavby a rozvoje vodohospodářské infrastruktury

Zdůvodnění relevance	Obce v území dotčeném dostavbou EDU se dlouhodobě potýkají s nedostatečnými kapacitami vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod (ČOV). Tyto limity představují překážku pro rozvoj území a snižují schopnost obcí reagovat na očekávané změny spojené s výstavbou – zejména s předpokládaným nárůstem počtu obyvatel a souvisejícími nároky na technickou infrastrukturu. Bez posílení této infrastruktury nemohou obce plánovat další rozvoj, ať už jde o kapacity pro ubytování pracovníků v dočasném pobytu, nové bytové projekty nebo rozšíření služeb a podnikatelských aktivit. Podpora by měla být cílená a navázaná na prokazatelné potřeby konkrétních obcí. Jednotlivé projekty mohou být podpořeny pouze za předpokladu důsledného vyhodnocení jejich efektivity.	
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí	
Spolupráce	Státní fond životního prostředí České republiky Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj Dotčené obce Společenství obcí	
Termín	01/2026	12/2030
Výstupy	• Identifikované a ověřené problematické oblasti infrastruktury • Dotační program	



	Realizované projekty zaměřené na rozvoj vodohospodářské infrastruktury (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod)		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Ověření potřeb území	MZe, dotčené obce	06/2026
	Příprava programu	MZe, MŽP, SFŽP ČR	do 12/2026
	Vyhlášení výzvy	MŽP	01/2027
	Realizace programu	SFŽP ČR	do 12/2030
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad finančních potřeb území cca 2,1 mld. Kč.		

11. Podpora projektové přípravy veřejných investic v území dotčeném dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU bude v dotčeném území vytvářet silný tlak na realizaci veřejných a soukromých investic, zejména v oblasti bydlení, dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti a podnikatelského prostředí. Úspěšná realizace těchto investic je podmíněna kvalitní projektovou přípravou, která zahrnuje změny územních plánů vyvolané dostavbou, zpracování studií, dokumentace pro povolení záměru, soutěžní dokumentace, dokumentace pro provedení stavby, smluvní dokumentace, ekonomických, technických a jiných analýz. Pro většinu zejména menších obcí v dotčeném území je ale taková příprava finančně a kapacitně nedosažitelná, přičemž bez ní není možné čerpat další investiční zdroje. Vhodným řešením je proto obcím poskytnout v rámci dotačního programu příspěvek na pořízení dokumentace pro povolení záměru a územně plánovací dokumentace. Opatření je také vhodné pro spolufinancování ze strany dotčených krajů. Z hlediska řešení dopadů je podstatné, aby tento nástroj byl k dispozici co nejdříve, neboť dotčenému území umožní se na řešení těchto dopadů včas připravit.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo pro místní rozvoj		
Spolupráce	Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Dotčené obce Společenství obcí Centrum pro regionální rozvoj České republiky		
Termín	09/2026	12/2029	
Výstupy	- Program na projektovou přípravu - Realizované projekty na podporu tvorby dokumentace pro povolení záměru a územně plánovací dokumentace		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Analýza potřeb	MMR, JMK, Kraj Vysočina	06/2026
	Příprava programu (dot. titulu)	MMR, JMK, Kraj Vysočina	do 12/2026
	Vyhlášení výzvy	MMR	01/2027
	Realizace programu	MMR, CRR	do 12/2029



Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad rozpočtu programu: cca 100–150 mil. Kč (na přibližně 40–60 projektů).
--	---

12. Konzultační a metodická podpora veřejných investic v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU bude v dotčeném území generovat výrazný tlak na související veřejné i soukromé investice, a to zejména v oblastech bydlení, dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti, ale také v rámci rozvoje podnikatelského prostředí. Předpokládaný růst potřeb a požadavků na územní rozvoj klade vysoké nároky na plánovací a investiční kapacity dotčených obcí, které často nedisponují potřebným odborným zázemím ani zkušenostmi s realizací komplexních investičních záměrů. V dotčeném území je proto vhodné zintenzivnit konzultační a metodickou podporu zaměřenou na přípravu, financování řízení veřejných investic, kterou zde již v současné době stát realizuje prostřednictvím SFPI. Činnost SFPI zde má také silnou vazbu na podporu dostupného nájemního bydlení a potřebu zajistit významný počet bytů v tomto režimu. Pro zajištění potřeb dotčeného území je tak důležité zde činnost SFPI zajistit v požadovaném rozsahu.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo pro místní rozvoj		
Spolupráce	Státní fond podpory investic Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Dotčené obce Společenství obcí		
Termín	01/2026	12/2036	
Výstupy	• Metodiky a nástroje pro plánování a realizaci veřejných investic • Podpořené projektové záměry v území		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Zajištění poradenské činnosti pro území dostavby EDU	MMR/SFPI	do 06/2026
	Tvorba a aplikace metodických nástrojů pro plánování a realizaci veřejných investic	SFPI, JMK, Kraj Vysočina	Průběžně
	Individuální konzultace a podpora obcí při přípravě investičních záměrů	SFPI	Průběžně
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Podmínkou je zajištění konzultantské a poradenské činnosti ze strany SFPI po r. 2026 (po celou dobu dostavby EDU). Odhad rozpočtu na činnosti SFPI v dotčeném území cca 10 mil. Kč ročně.		

13. Posílení výkonu státní správy ve vybraných správních činnostech na úseku stavebního řízení

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU v dotčeném území povede k výraznému nárůstu investičních a stavebních aktivit (např. bytová výstavba, liniové stavby, rozvoj podnikatelských areálů), což podstatně zvýší zátěž
-----------------------------	--



	na DESÚ, ale i na obce vykonávající působnost stavebních úřadů podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. DESÚ a tyto obce budou nuceny vedle běžné agendy stavebního řízení zvládat i mimořádný objem správních úkonů spojených s dostavbou EDU. S ohledem na problémy, jež dlouhodobě provázejí proces stavebního řízení v ČR, zejména nedostatek kvalifikovaných pracovníků stavebních úřadů, lze v souvislosti s dostavbou očekávat, že zde bude docházet k prohlubování personální i kapacitní krize na těchto úřadech. Tato situace je dále komplikována odlivem odborníků z těchto úřadů do firem podílejících se na dostavbě EDU. Dotčené území se na dostavbu dle studie musí připravovat již v současné době, aby nejen zmírnilo negativní dopady dostavby, ale dokázalo efektivně využít její příležitosti. Proto je nutné zajistit posílení činnosti stavebních úřadů v co nejkratší době, nicméně nejdříve je nutné identifikovat očekávané dopady na jednotlivé typy stavebních úřadů v příslušných lokalitách (stavební úřad, DESÚ, stavební úřady ORP, místní stavební úřady, krajské stavební úřady). Podle § 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží obcím příspěvek na výkon přenesené působnosti, avšak jeho současné nastavení neumožňuje pružně reagovat na situace spojené s mimořádným nárůstem správních činností. Zajištění plynulého výkonu státní správy v oblasti stavebního řízení proto vyžaduje zavedení výkonového financování, které ale umožní dotčeným obcím se stavebním úřadem se na zvýšenou zátěž připravit. Zavedení výkonového financování agendy stavebního řádu předpokládá Ministerstvo vnitra od roku 2027 (v závislosti na zavedení digitálního stavebního řízení).		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo vnitra		
Spolupráce	Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo financí Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj DESÚ, obce se stavebním úřadem v dotčeném území		
Termín	01/2026	12/2036	
Výstupy	• Výkonové financování agendy stavebního řízení • Funkční výkon státní správy na úseku stavebního řízení		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Ověření zatížení stavebních úřadů v dotčeném území	MV, MMR, dotčené obce	06/2026
	Zavedení výkonového financování agendy stavebního řádu	MV, MMR a MF	od 01/2027
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Zavedení výkonového financování od roku 2027 je odvislé od úspěšné digitalizace stavebního řízení; případně je nutné hledat jinou formu posílení agendy stavebního řádu v dotčených obcích.		

14. Posílení přenosové a distribuční soustavy v území dotčeném dostavbou EDU			
Zdůvodnění relevance	V území dotčeném dostavbou EDU je lokálně distribuční síť na hranici své kapacity, což omezuje možnosti připojení nových odběrných míst a představuje významnou bariéru pro rozvoj obcí. Nedostatečná energetická infrastruktura omezuje v obcích realizaci projektů v oblasti bydlení, podnikání a veřejných služeb, a tím oslabuje schopnost regionu reagovat na očekávané změny způsobené dostavbou EDU. Problémy s nedostatečnou kapacitou byly identifikovány zejména v oblastech Moravsko-Budějovicka a Znojemska, dále pak lokálně v dalších obcích, které mají zájem o rozvojovou výstavbu nebo podnikatelské záměry. S ohledem na předpokládaný nárůst obyvatel a ekonomických aktivit je nezbytné zajistit odpovídající kapacitu přenosové a distribuční sítě. Opatření vyžaduje spolupráci státu a relevantních subjektů s kompetencí v oblasti energetické infrastruktury.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo průmyslu a obchodu		
Spolupráce	ČEPS Distributoři		
Termín	01/2026	12/2030	
Výstupy	- Realizované investiční projekty na posílení kapacit přenosové a distribuční soustavy - Zvýšená kapacita pro připojení nových odběrných míst v dotčených obcích - Odstranění konkrétních úzkých míst omezujících rozvoj území		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Ověření technických bariér a úzkých míst v přenosové a distribuční síti	MPO, ČEPS, distributoři	06/2026
	Vytvoření rozvojového plánu	MPO, ČEPS, distributoři	12/2026
	Realizace investičních akcí	ČEPS, distributoři	12/2030
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Náklady budou upřesněny na základě rozvojového plánu a technického ověření. Financování předpokládá kombinaci zdrojů provozovatelů přenosové a distribuční soustavy a případné zdroje z veřejných rozpočtů, které musejí být v souladu s pravidly veřejné podpory a energetické politiky ČR.		

4.1.3 Oblast dopravy

15. Opatření na dopravní infrastrukturu obcí dotčených dostavbou EDU	
Zdůvodnění relevance	Na základě výsledků studie a následných jednání se samosprávami dotčených obcí a krajů byla identifikována potřeba řešení důsledků zvýšené dopravní zátěže související s dostavbou EDU. Ta bude mít zásadní dopad na dopravní infrastrukturu, a to jak z hlediska pravidelné dopravy výstavbového personálu, tak i intenzivních návozu stavebního materiálu, technologií a surovin.



	Dopravní zátěž se bude koncentrovat zejména do obcí v okolí staveniště a podél hlavních návozdových tras či zdrojů surovin, což bude vytvářet zvýšené nároky na bezpečnost a kapacitu stávající dopravní infrastruktury. Je velmi pravděpodobné, že bude docházet ke vzniku lokálních problémů, které je třeba řešit úpravami silniční sítě a prvků dopravního zklidnění (např. autobusové zálivy, chodníky, přechody pro chodce, zpomalovací prvky, světelná signalizace, kamerové systémy a další opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu). Uvedená opatření nejsou v gesci Ministerstva dopravy, spol. Elektrárna Dukovany II, a. s., ani vybraného dodavatele, a nejedná se o opatření vyplývající z usnesení vlády ČR ze dne 7. 2. 2024 č. 102 „Zajištění financování úprav dopravní infrastruktury v souvislosti s výstavbou jaderného zdroje v elektrárně Dukovany“ a usnesení vlády ze dne 4. 6. 2025 č. 402. Předmětem navrhovaného opatření budou doplňková opatření k řešení rizikových míst na zadaných úsecích návozdových tras. Doplňková opatření budou realizována na místních komunikacích dotčených obcí.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo pro místní rozvoj		
Spolupráce	Ministerstvo dopravy Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Dotčené obce Společenství obcí Elektrárna Dukovany II, a. s.		
Termín	Od 01/2026	Do 12/2036	
Výstupy	- Seznam lokalit a konkrétních opatření pro zvýšení bezpečnosti a kapacity komunikací - Realizované projekty na rozvoj místních komunikací dopravní infrastruktury (zálivy, přechody, chodníky apod.) - Snížení negativních dopadů na dotčené obce		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Identifikace exponovaných lokalit a návrh konkrétních technických opatření	Kraje, EDU II, dotčené obce	06/2026
	Příprava programu (dot. titulu)	MMR	do 12/2026
	Vyhlášení výzvy	MMR	01/2027
	Realizace programu	MMR	do 2036
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Prokázání relevance podpory ve vztahu k dostavbě EDU na úrovni konkrétního projektu – studie proveditelnosti žadatele. Odhad rozpočtu na program: 300 mil. Kč.		

16. Podpora rozvoje infrastruktury pro zlepšení dopravní obslužnosti dostavby EDU

Zdůvodnění relevance	V souvislosti s dostavbou EDU se očekává nárůst každodenní mobility zaměstnanců, pracovníků dodavatelských firem a dalších subjektů zapojených do výstavby. Již v současné době není dopravní obslužnost daného území dostatečná a z hlediska dalšího rozvoje je vhodné zajistit odpovídající dopravní infrastrukturu umožňující efektivní, bezpečný a udržitelný přístup k lokalitě dostavby EDU.
-----------------------------	---



	V oblasti Dukovan již v současnosti dochází ke zhoršování dopravní situace v důsledku zajištění provozu jaderné elektrárny. Zejména během střídání směn vznikají lokální kongesce a v důsledku převažující individuální dopravy se objevují problémy s parkováním v okolí. Cílem opatření je proto zvýšit atraktivitu veřejné a alternativní dopravy (např. cyklo dopravy), které představují dlouhodobě udržitelnější a efektivnější variantu dopravy k EDU. Opatření je zaměřeno výhradně na podporu infrastrukturních dopravních projektů, které mají prokazatelnou vazbu na dostavbu EDU, zejména ve vztahu k potřebám dojížděky stávajících a budoucích zaměstnanců a provozním vazbám na lokalitu. Součástí opatření je výstavba a modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu (např. zastávky a přestupní body, budování parkovacích kapacit v podobě P+R parkovišť navázaných na hlavní dopravní uzly, budování cyklostezek propojujících lokalitu EDU s lokalitami bydlení zaměstnanců atd.). Tímto způsobem bude podpořeno snížení závislosti na individuální automobilové dopravě a bude posílena celková udržitelnost dopravního systému v souvislosti s dostavbou EDU Podpora není určena pro řešení běžných dopravních potřeb území bez vazby na dostavbu EDU. Každý projekt bude muset prokázat souvislost s realizací dostavby EDU. Opatření rovněž navazuje na aktivity krajů v oblasti optimalizace systému veřejné dopravy v dotčeném území.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo pro místní rozvoj		
Spolupráce	Ministerstvo dopravy Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj Dotčené obce Společenství obcí Svazky obcí Centrum pro regionální rozvoj České republiky		
Termín	01/2026	12/2032	
Výstupy	• Vybudovaná infrastruktura pro veřejnou a alternativní dopravu (zastávky, přestupní body, P+R parkoviště, cyklostezky) • Zvýšení podílu veřejné a alternativní dopravy • Zlepšení dopravní obslužnosti území v návaznosti na dostavbu EDU • Snížení závislosti na individuální automobilové dopravě v dotčeném území		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Příprava programu (dot. titulu)	MMR, CRR	do 12/2026
	Konzultace v oblasti přípravy, výstavby a údržby dopravní infrastruktury	MD	do 12/2026
	Vyhlášení výzvy	MMR	01/2027
	Realizace programu	MMR, CRR	do 12/2032
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Prokázání relevance podpory ve vztahu k dostavbě EDU na úrovni konkrétního projektu. Spolupráce ze strany MD při nastavování dotačního programu. Odhad rozpočtu na program: 2,2 mld. Kč (vychází z odhadu sběru podnětů na úrovni krajů a vyhodnocení jejich relevance).		



17. Prevence objíždění návozdových tras a optimalizace dopravních proudů v souvislosti s dostavbou EDU			
Zdůvodnění relevance		V souvislosti s dostavbou EDU a intenzivními návozy materiálů a surovin bude nezbytné zajistit identifikovatelnost nákladních automobilů, které přepravují stavební materiál a suroviny, čímž se eliminuje objíždění návozdových tras a optimalizují se dopravní proudy. Součástí ujednání se zhotovitelem stavby bude povinnost vést evidenci o využívání dopravní infrastruktury v okolí staveniště. Součástí opatření bude vytvoření prediktivního dopravního modelu, který umožní simulaci dopravní zátěže (nákladní, veřejná a osobní doprava), a to nejen vyvolané dostavbou EDU, ale i dalšími očekávanými významnými stavbami probíhajícími v termínovém souběhu s výstavbou NJZ EDU (vysokorychlostní trať, nové komunikace atd.). Dále bude možné pomocí tohoto systému modelování změny tras dopravních proudů, posouzení kapacity dopravní infrastruktury a vyhodnocení dopravních opatření, včetně dopadů na životní prostředí. Tento model přispěje k přesnějšímu plánování a řízení dopravy na místní úrovni, zaměří se na optimalizaci tras, identifikaci problémových míst a minimalizaci vlivu na ostatní dopravní toky v dotčených obcích. Model je také podstatný z hlediska vyhodnocení dopadů na dopravní infrastrukturu při souběhu dalších dopravních staveb v dotčeném území. Model bude založen na analýze dopravní zátěže na různých úrovních – makro (regionální), mezo (lokální) a mikro (individuální trasy a konkrétní oblasti), což umožní detailní simulace a posouzení všech aspektů dopravního zatížení a efektivnosti dopravních opatření. Výstupy z modelu budou sloužit jako podklad pro plánování dopravních opatření, rozhodování a komunikaci s odbornou i laickou veřejností.	
Zodpovědnost / garant		<i>Bude doplněno po projednání Meziresortní pracovní skupinou Dukovany</i>	
Spolupráce		Ministerstvo dopravy Ministerstvo průmyslu a obchodu (Elektrárna Dukovany II, a. s.) Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Dotčené obce Společenství obcí Složky IZS	
Termín		01/2026	12/2038
Výstupy		- Poskytnutá data společností EDU II pro sledování vytížení dopravní infrastruktury, případně data z dalších časově souběžných významných staveb - Prediktivní dopravní model pro optimalizaci tras - Doporučení dopravních opatření pro zajištění plynulé dopravy - Při prokázání škod způsobených dostavbou EDU na komunikacích kraje a dotčených obcí vytvoření systému kompenzací	
Plánované aktivity		Popis	Dílčí zodpovědnost
		Zavedení systému pro sledování využívání dopravní infrastruktury	EDU II
			Indikativní termín
			Dle smluvních vztahů



	nákladními vozidly a pro sběr dat		
	Vytvoření a nasazení prediktivního dopravního modelu	Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj	do 5/2027
	Optimalizace tras na základě prediktivního dopravního modelu	Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, MD	Po dobu dostavby
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Poskytnutí dat ze strany relevantních subjektů.		

4.1.4 Oblast podpory podnikání a trhu práce

18. Podpora vytvoření inovačního a investičního zázemí navázaného na dostavbu EDU	
Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU představuje strategickou investici státu s významnými dopady na celou českou ekonomiku, ale primárně na ekonomický a sociální rozvoj dotčeného území. Stávající elektrárna a její dostavba nabízí výjimečnou příležitost pro vznik stabilního a silného inovačního a investičního zázemí navázaného na jadernou energetiku a související technologická odvětví. Region se vyznačuje dlouhodobou průmyslovou tradicí a vysokou mírou akceptace jaderné energetiky. Současně zde již působí řada podnikatelských subjektů s návazností na energetický a technologický sektor. Tyto faktory představují základ pro vznik silné specializace území v oblasti energetických a technických inovací. Dostavba představuje příležitost pro rozvoj infrastruktury, která by umožnila efektivní lokalizaci nových technologických a výrobních kapacit. Zlepšení potenciálu využití brownfieldů, podpora investic do místní ekonomiky a podpora provázanosti mezi podnikatelským a inovačním prostředím mohou zlepšit atraktivitu území a vytvořit v rámci České republiky unikátní inovační ekosystém např. jaderný inovační hub, jaderný inovační cluster. Cílená podpora státu v souvislosti s dostavbou EDU tak může posílit dlouhodobou hospodářskou odolnost regionu, jeho význam a specializaci a přispěje k udržení mladé a kvalifikované pracovní síly, což může přispět k odstranění stávajících strukturálních problémů území.
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo průmyslu a obchodu
Spolupráce	Ministerstvo pro místní rozvoj CzechInvest SIRS ÚZSVM Úřad práce České republiky Kraj Vysočina Jihomoravský kraj (JIC, JINAG) Vysoké školy Hospodářská komora
Termín	01/2026 12/2038
Výstupy	Lokalizační strategie pro investice v dotčeném území.



	- Vytvoření podmínek pro vznik inovačních hub a start-upů zaměřených na jadernou energetiku, propojení s národními a mezinárodními inovačními ekosystémy. - Rozvoj podpůrné infrastruktury v oblasti dopravy, energetických kapacit a digitální infrastruktury pro podporu inovačních firem a nových investic.		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Vypracování inovační a lokalizační strategie pro investice v dotčeném území	MPO, SIRS, CzechInvest	12/2026
	Nastavení systému bonifikace dotčeného území ve stávajících programech MPO / CzechInvestu na podporu inovací a podnikání	MPO	12/2026
	Podpora inovačních aktivit zaměřených na jadernou energetiku a navazující odvětví	CzechInvest, SIRS	do 12/2038
	Koordinace a provázání činnosti státních a regionálních aktérů v rámci inovačních aktivit	MPO, CzechInvest, SIRS, kraje	do 12/2038
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Vytvoření inovační infrastruktury v dotčeném území. Finanční prostředky na inovační aktivity budou specifikovány na základě inovační a lokalizační strategie.		

19. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Studie identifikovala zásadní strukturální změny na trhu práce v dotčeném území. Očekává se deficit až 10 000 pracovníků v produktivním věku v souvislosti s výstavbou a s ní spojeným rozvojem ekonomických aktivit. Pro zmírnění tohoto dopadu je nezbytné aktivně podpořit pracovní mobilitu a přizpůsobit disponibilní pracovní sílu prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Klíčovou roli zde hrají krajské pobočky Úřadu práce ČR – Vysočina, Jihomoravského a Jihočeského (vazba na JE Temelín) kraje, zejména kontaktní pracoviště Třebíč a Moravský Krumlov, kde je nezbytné personální posílení, zajištění potřebného zázemí a technického vybavení. Součástí opatření je příprava regionálního cíleného programu. Podle ustanovení § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, řeší cílené programy v oblasti zaměstnanosti problémy obecního, okresního, krajského či celostátního charakteru. Regionální cílený program připravuje Úřad práce ČR a schvaluje MPSV. Regionální cílený program bude zaměřen na zajištění pracovní síly v jednotlivých fázích projektu EDU II (poradenství, rekvalifikace, mzdové příspěvky, příspěvek na regionální mobilitu apod.), např. v oblasti stavebnictví, strojírenství, logistika, energetika a technické profese. Realizace bude vyžadovat navýšení prostředků státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti.
-----------------------------	--



Zodpovědnost / garant	Ministerstvo práce a sociálních věcí		
Spolupráce	Úřad práce České republiky (příprava programu) Elektrárna Dukovany II, a. s. Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS) Asociace pracovních agentur (APA) Zaměstnavatelé a jejich střešní organizace		
Termín	01/2026	12/2036	
Výstupy	• Posílení regionální kapacity ÚP ČR (navýšení počtu systemizovaných míst ÚP ČR) • Cílený program podle § 120 zákona o zaměstnanosti		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Identifikace potřebných profesí	EDU II, HK, zaměstnavatelé, ÚP ČR	01/2026
	Posílení personálních kapacit Úřadu práce ČR	MPSV, ÚP ČR	01/2027
	Příprava cíleného programu k řešení zaměstnanosti a jeho zahájení	MPSV, ÚP ČR	06/2027
	Realizace programu	ÚP ČR	do 12/2038
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Navýšení prostředků státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti. Odhad potřeby finančních prostředků a systemizovaných míst ÚP ČR bude upřesněn.		

20. Posílení kontrolní kapacity v oblasti inspekce práce v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU představuje rozsáhlou a personálně náročnou investici s předpokládaným zapojením několika tisíc pracovníků, včetně značného počtu zaměstnanců ze zahraničí. Tento rozsah zvyšuje nároky na dohled nad dodržováním pracovněprávních předpisů, především v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), v dalších fázích vzrostou nároky na dohled při dodržování pracovně právních předpisů, včetně dohledu nad umožněním výkonu nelegální práce. V současné době nejsou obecně kapacity oblastních inspektorátů práce a Technické inspekce České republiky v dotčeném území dostatečné pro zajištění efektivního a pravidelného výkonu kontrolní a dozorové činnosti. Pro zajištění řádného a bezpečného průběhu výstavby je proto nezbytné uvedené kontrolní a dozorové orgány (příslušné oblastní inspektoráty práce, Státní úřad inspekce práce a Technickou inspekci České republiky) výrazně posílit jak personálně, tak technicky. Účelem opatření je vytvořit podmínky pro zajištění akceschopnosti Státního úřadu inspekce práce, příslušných oblastních inspektorátů práce a Technické inspekce České republiky, a to prostřednictvím posílení personální kapacity, zajištění odpovídajících pracovních podmínek kontrolních pracovníků včetně jejich odpovídajícího ohodnocení.
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo práce a sociálních věcí



Spolupráce	Státní úřad inspekce práce Technická inspekce České republiky Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Ministerstvo vnitra Elektrárna Dukovany II, a. s.		
Termín	01/2026	12/2036	
Výstupy	• Navýšené kapacity kontrolních orgánů • Zajištěné důstojné podmínky pro výkon kontrolní činnosti • Pravidelně realizované cílené kontroly na místě stavby EDU • Snížení rizika úrazů, nelegálního zaměstnávání a porušování BOZP a dalších povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů • Vytvoření detašovaného pracoviště pro inspekci práce přímo na stavbě k zajištění nezbytného zázemí pro inspektory.		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Zhodnocení kapacit inspektorátu včetně potřeb technického a personálního zajištění a zpracování plánu na jejich posílení	MPSV, SÚIP	01/2026
	Zajištění lepší konkurenceschopnosti při financování (posílení platů zaměstnanců kontrolních orgánů), náboru a vybavení pro rozšíření kontrolních týmů	MPSV, MF	01/2027
	Zahájení činnosti v rámci povolovacího řízení	SÚIP, EDU II	03/2026
	Poskytování vyjádření k projektovým dokumentacím a plánům BOZP	SÚIP	03/2026
	Zahájení cílené kontrolní činnosti v oblasti BOZP, zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů a podmínek v místě výstavby EDU	SÚIP, EDU II	od 04/2027
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad rozpočtu MPSV / SÚIP bude stanoven až po provedení zhodnocení personálních kapacit inspektorátu a potřeb technického zajištění, a to včetně zhodnocení kapacit Technické inspekce České republiky. Koordinace s harmonogramem stavby a logistickými možnostmi v regionu a spolupráce s investorem.		



4.1.5 Oblast školství a vzdělávání

21. Vytvoření vládního programu na podporu vysokých škol v oblasti jaderné energetiky a souvisejících oborů			
Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU a další plánované projekty v oblasti jaderné energetiky vyžadují kvalifikované odborníky v oborech jako jaderné inženýrství, reaktorová fyzika, jaderná chemie a související technické disciplíny. V dotčeném území dostavby EDU se také zvýší poptávka po vysokoškolských oborech reagující na potřeby zaměstnavatelů (např. zdravotnictví, školství, sociální služby). Vysoké školy hrají klíčovou roli v přípravě těchto odborníků prostřednictvím akreditovaných studijních programů a výzkumných aktivit.		
	Nedostatek kvalifikovaných odborníků v oblasti jaderné energetiky a souvisejících oborů je dlouhodobým problémem, který může ohrozit realizaci plánovaných projektů a provoz jaderných zařízení. Vysoké školy potřebují adekvátní podporu a podmínky pro rozvoj studijních programů, výzkumu a spolupráce s průmyslem, aby mohly efektivně reagovat na rostoucí poptávku po odbornících v tomto sektoru nebo řešit dopady strukturálních změny dostavby EDU v dotčeném území.		
	Cílem je navrhnout specifický program na podporu vzdělávacích kapacit a vědecké činnosti v oblasti jaderné energetiky a programy reagující na potřeby zaměstnavatelů v dotčeném území. Tyto programy budou klíčové pro zajištění kvalitní přípravy a udržení odborných kapacit v souladu se zájmy České republiky v oblasti energetiky a dalších oborů.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		
Spolupráce	Ministerstvo průmyslu a obchodu Vysoké školy Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů		
Termín	01/2026	12/2035	
Výstupy	- Analýza potřeb absolventů v klíčových oborech ve vazbě na výstavbu a provoz EDU - Schválený vládní program s definovanými cíli, nástroji podpory a rozpočtem - Realizace vládního programu podpory		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Vyhodnocení aktuálních potřeb a možností vysokých škol pro oblast jaderné energetiky	MŠMT, MPO, vysoké školy	06/2026
	Návrh a schválení programu na podporu vysokých škol v oblasti jaderné energetiky	MŠMT, MPO, Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů	12/2026
	Realizace programu	MŠMT	do 12/2035
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Disponibilita finančních prostředků státního rozpočtu na vytvoření a implementaci programu. Potřebná výše finančních prostředků na program bude upřesněna.		



22. Přizpůsobení regionálního vzdělávacího systému v souvislosti s dostavbou EDU			
Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU představuje impuls pro lokální pracovní trh, zejména v oblasti energetiky, a vyvolává potřebu přizpůsobení oborové struktury středního školství a vyšších odborných škol (VOŠ) v souladu s požadavky zaměstnavatelů. To si žádá adaptaci vzdělávacího systému, který musí reagovat na dynamiku trhu práce. V souladu s „Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky“ a jednotlivých krajů je nezbytné přizpůsobit oborovou strukturu středního a vyššího odborného školství tak, aby bylo možné flexibilně reagovat na potřeby pracovního trhu. Součástí tohoto přizpůsobení je i intenzifikace vzdělávacích oborů, která umožní rychlejší přeškolení a rekvalifikaci pracovníků podle aktuálních požadavků zaměstnavatelů. Důležitou součástí těchto opatření je i vhodné nastavení financování a podpory těchto oborů.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy		
Spolupráce	Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Dotčené vzdělávací instituce Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad práce České republiky		
Termín	01/2026	12/2035	
Výstupy	- Přizpůsobení Školních vzdělávacích programů oborů středního a vyššího odborného školství potřebám trhu práce - Zvýšení kapacity oborů zaměřených na potřeby trhu práce		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Analýza potřeb trhu práce a školství	MŠMT, kraje	12/2026
	Přizpůsobování oborové struktury středního a vyššího odborného školství	MŠMT, kraje, dotčené školy	Průběžně
	Vhodné nastavení financování škol dle specifických potřeb oborů	MŠMT	Průběžně
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Disponibilita finančních prostředků státního rozpočtu. Potřebná výše finančních prostředků bude upřesněna.		



23. Rozvoj vzdělávací infrastruktury regionálního školství v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance			
Dostavba EDU v dotčeném území může lokálně vést k potřebě investic do vzdělávací infrastruktury, zejména mateřských, základních a případně středních škol. Vzhledem k tomu, že v dotčeném území jsou v současné době kapacity vzdělávacích zařízení dostatečné, musí být případné investice do vzdělávací infrastruktury odůvodněny konkrétními potřebami vyplývajícími z dostavby EDU. Podpora bude zaměřena na obce, které budou zatíženy zvýšeným počtem nově trvale usídlených obyvatel v souvislosti s dostavbou EDU, případně budou reagovat na specifické potřeby, jako je vzdělávání cizinců, modernizace učeben a vybavení škol v souvislosti s výukou potřebných profesí atd. Financovány nebudou běžné rozvojové záměry vzdělávacích zařízení bez jasné vazby na prokázané dopady dostavby EDU. V dotčeném území Brněnské metropolitní oblasti (BMO), kde se překrývají dopady dostavby EDU s přirozeným populačním nárůstem, zejména v důsledku suburbanizace a migrace, může být podpora vzdělávací infrastruktury realizována prostřednictvím této intervence, pokud bude prokázána přímá souvislost s dostavbou EDU. V případech, kde kapacitní potřeby vyplývají primárně z obecného demografického vývoje bez přímé vazby na EDU, budou tyto potřeby řešeny samostatnými rozvojovými intervencemi státu zaměřenými na BMO.			
Zodpovědnost / garant			
<i>Bude doplněno po projednání Meziresortní pracovní skupinou Dukovany</i>			
Spolupráce			
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Dotčené obce			
Termín			
01/2026 12/2030			
Výstupy			
- Program zaměřený na podporu vzdělávací infrastruktury vázanou na dostavbu EDU - Realizované projekty zaměřené na rozvoj vzdělávací infrastruktury			
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Analýza potřeb vzdělávací infrastruktury daného území	<i>Bude doplněno po projednání Meziresortní pracovní skupinou Dukovany</i>	<i>bude doplněno</i>
	Příprava programu (dot. titulu)	<i>Bude doplněno po projednání Meziresortní pracovní skupinou Dukovany</i>	do 12/2026
	Vyhlášení výzvy	<i>Bude doplněno po projednání Meziresortní pracovní skupinou Dukovany</i>	01/2027
	Realizace programu	<i>Bude doplněno po projednání Meziresortní</i>	do 12/2030



		<i>pracovní skupinou Dukovany</i>	
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Prokázání relevance podpory ve vztahu k dostavbě EDU na úrovni konkrétního projektu – studie proveditelnosti žadatele Rozpočet na opatření bude upřesněn na základě výsledků analýzy potřeb.		

4.1.6 Oblast zdravotnictví a sociálních služeb

24. Vyhodnocení systému přidělování státního příspěvku na krizovou připravenost zdravotnické záchranné služby kraje			
Zdůvodnění relevance	V souvislosti s plánovanou dostavbou EDU se očekává výrazné navýšení zátěže zdravotnického systému v důsledku zvýšené intenzity dopravy, vysokého objemu stavebních prací, trvalé přítomnosti jaderného zdroje a zvýšeného počtu zahraničních pracovníků v regionu. Tato kombinace faktorů představuje vyšší pravděpodobnost mimořádných událostí a specifické nároky na krizovou připravenost. Příspěvek na krizovou připravenost ZZS ve výši 10 Kč na obyvatele nebyl valorizován od svého zavedení. S ohledem na změny bezpečnostního prostředí je vhodné provést vyhodnocení systému přidělování příspěvku na krizovou připravenost za posledních 10 let s cílem posoudit jeho případnou úpravu a způsob poskytování.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo zdravotnictví		
Spolupráce	Zdravotnické záchranné služby krajů Kraje		
Termín	01/2026	12/2026	
Výstupy	- Vyhodnocení systému přidělování státního příspěvku na krizovou připravenost zdravotnické záchranné služby kraje - Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k případné úpravě příspěvku na krizovou připravenost		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Sběr a vyhodnocení dat o čerpání finančního příspěvku na krizovou připravenost za posledních 10 let	MZdr, ZZS krajů, krajské úřady (kraje)	06/2026
	Vyjádření k účelnosti úpravy mechanismu příspěvku	MZdr, MF	09/2026
	Návrh úpravy systému poskytování příspěvku, popř. návrh na změnu právních předpisů	MZdr, MF, krajské úřady (kraje)	12/2026
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Případné navýšení příspěvku na připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací je vázáno na disponibilitu finančních prostředků státního rozpočtu. Spolupráce s dotčenými ministerstvy, kraji a poskytovateli ZZS.		



25. Ověření připravenosti nemocnic v území dotčeném dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU představuje významnou změnu pro infrastrukturu Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, což vyžaduje odpovídající úroveň zdravotní péče pro jak pracovníky EDU, tak jejich rodinné příslušníky. Vzhledem k potenciálním rizikům spojeným s výstavbou, jako jsou vážné úrazy na staveništi, zvýšená frekvence dopravních nehod a nutnost reakce na zvýšený počet výskytu infekčních chorob, je nezbytné rozšířit kapacity zdravotní péče také v nemocnicích. Opatření zahrnuje projekty zaměřené na posílení infrastruktury pro urgentní medicínu, traumatologii a infekční péči, což zajistí efektivní a včasnou pomoc v případě neodkladných situací. Posílení těchto kapacit je kladeno na zvládnání rizik spojených s dostavbou EDU i na zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče pro stávající obyvatele dotčeného území. Tyto projekty rovněž přispějí k rozvoji zdravotnické infrastruktury, která bude mít trvalý pozitivní dopad na péči o zdraví obyvatelstva, i po dokončení výstavby.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo zdravotnictví		
Spolupráce	Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Dotčené nemocnice (krajské, fakultní)		
Termín	01/2026	12/2031	
Výstupy	• Posílení kapacit pro urgentní medicínu a traumatologii na dotčeném území • Rozšíření kapacit pro péči o infekční pacienty		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Ověření relevance a opodstatněnosti posílení kapacit zdravotní péče v souvislosti s dostavbou EDU	MZdr	01/2026
	Posílení kapacit pro urgentní medicínu, traumatologii a infekční lékařství	MZdr, kraje, vytipované nemocnice	12/2028
	Optimalizace zázemí fakultních nemocnic v JMK pro poskytování specializované péče	Fakultní nemocnice u sv. Anny, FN Brno	12/2031
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Spolupráce MZdr s dotčenými kraji. Odhad rozpočtu cca 120–150 mil. Kč do roku 2031 pro fakultní nemocnice. Skutečné požadavky na rozpočet budou výsledkem ověření.		

26. Podpora dostupnosti zdravotní péče v území dotčeném dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU v dotčeném území dále prohloubí nižší dostupnost primární péče (praktici, pediatři, stomatologové, gynekologové a specialisté), než je standardem dotčených krajů. Úroveň dostupnosti se dle studie odlišuje lokálně a v čase se mění s ohledem na věkovou strukturu lékařů. Opatření má za cíl zajistit, aby se úroveň primární péče v důsledku dostavby EDU ještě více nezhoršila.
-----------------------------	--



	V případě poskytování akutní péče v dotčeném území je problémem zejména nedostatek zdravotnického personálu v nemocnicích zřizovaných kraji. Tyto nemocnice jsou však klíčové nejen z důvodu zajištění běžné zdravotní péče, ale jsou důležitými zdravotnickými zařízeními v případě krizových situací. V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, je pro dotčené území zásadní, aby zdravotní pojišťovny aktivně přistupovaly k zajištění odpovídající dostupnosti péče zejména podporou dostatečných smluvních kapacit.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo zdravotnictví		
Spolupráce	Zdravotní pojišťovny Krajské nemocnice (Nemocnice Třebíč, Znojmo, Ivančice) Dotčené obce Společenství obcí		
Termín	01/2026	12/2038	
Výstupy	Posílená dostupnost a kapacita zdravotní péče v regionu, včetně primární péče (praktici, pediatři, stomatologové, gynekologové, specialisté) a nemocniční péče (akutní, specializovaná atd.).		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Průběžné sledování dostupnosti zdravotní péče a vývoje potřeb	Zdravotní pojišťovny	Po dobu dostavby
	Zajištění kapacit odpovídající potřebám prostřednictvím nástrojů smluvní a úhradové politiky zdravotních pojišťoven	Zdravotní pojišťovny	Po dobu dostavby
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Fondy zdravotních pojišťoven Využití dotačního programu MZdr „Rezidenční místa”		

27. Rozvoj krajské zdravotní infrastruktury v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU v dotčeném území povede také k potřebě modernizace vybrané zdravotnické infrastruktury, zejména zařízení ve vlastnictví dotčených obcí (např. ordinace, polikliniky) a krajských nemocnic v Třebíči, Znojmě a Ivančicích. Tato potřeba je však lokálně ohraničena a vychází z konkrétních potřeb vybraných obcí a příslušných nemocnic. Z tohoto důvodu je nutné vytvořit dotační nástroj, který umožní spolufinancování pouze těch infrastrukturních projektů, jejichž přímá vazba na dostavbu EDU je prokazatelná. Podpora musí být striktně omezena na investice vycházející z konkrétních dopadů dostavby (např. vybudování nových ordinací v obcích se zhoršující dostupností péče v důsledku navýšené poptávky nebo modernizace technického zázemí vybraných krajských nemocnic, které budou zajišťovat péči pro zaměstnance a dodavatele stavby). Financovány nemohou být běžné rozvojové záměry bez jasné vazby na prokazatelné dopady dostavby EDU.
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo zdravotnictví
Spolupráce	Ministerstvo zdravotnictví Kraj Vysočina



	Jihomoravský kraj Krajské nemocnice (Nemocnice Třebíč, Znojmo, Ivančice)		
Termín	01/2026	12/2032	
Výstupy	• Program zaměřený na podporu zdravotnické infrastruktury vázané na dostavbu EDU • Realizované projekty zaměřené na rozvoj zdravotnické infrastruktury		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Příprava programu	MZdr	do 12/2026
	Vyhlášení výzvy	MZdr	01/2027
	Realizace programu	MZdr	do 12/2030
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Prokázání relevance podpory ve vztahu k dostavbě EDU na úrovni konkrétního projektu. Odhad rozpočtu: 200 mil. Kč dotčené obce se zdravotní infrastrukturou. 2,4 mld. Kč dotčené kraje. Skutečný požadavek na státní rozpočet bude upřesněn na základě ověření relevance a opodstatněnosti posílení kapacit zdravotní péče v rámci opatření 25.		

28. Podpora dostupné péče o děti v souvislosti s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dopadová studie dostavby EDU identifikovala riziko nedostatečných kapacit předškolních zařízení v některých lokalitách dotčeného území. Podle studie bude v dotčeném území chybět až 1 600 míst v mateřských školách, přičemž část z tohoto počtu bude doplněna budováním jejich nových kapacit. Tento tlak je způsoben kombinací nedostatečné kapacity mateřských škol v některých obcích, zvýšené porodnosti v důsledku přílivu pracovníků podílejících se na výstavbě a navazujících ekonomických aktivitách. Vzhledem k omezeným kapacitám stávajících mateřských škol je nutné reagovat rychle dostupným a flexibilním řešením. Za účelem řešení nedostatku kapacit v mateřských školách je částečně vhodné využít stávající nástroj Ministerstva práce a sociálních věcí – účelově vázaný, nárokový státní příspěvek na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DS“) (financování provozu DS je zajišťováno skrze státní příspěvek na provoz DS, příspěvku od rodičů, případně dalších zdrojů). Příspěvek je mandatorním výdajem státního rozpočtu, po splnění podmínek na něj má poskytovatel služby péče o dítě v DS s platným oprávněním nárok. Dotčeným obcím může v souvislosti s místem trvalého pobytu dítěte (u cizinců pobytu) vzniknout povinnost obce zajistit podmínky pro výchovnou péči o dítě ode dne 3. narozenin do 31. srpna (zákon o DS), která předchází povinnosti obce zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání. Příspěvek na provoz DS nehradí vznik nových zařízení, ale pouze jejich provoz. Financování výstavby dětských skupin z Národního plánu obnovy ve smyslu nových výzev již v dalším roce nebude probíhat. Podpora budování dětských skupin v období 2025–2029
-----------------------------	---



	je zajišťována skrze Evropský sociální fond v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. V první polovině roku 2026 se plánuje vyhlášení výzvy na podporu vytvoření a provozu dětských skupin, která zřejmě bude, stejně jako výzva vyhlášená v roce 2025, mimo jiné regionálně omezena. Toto omezení, pokud bude aplikováno, bude opět provedeno dle aktuálních dat potřeby vytvoření dětských skupin v jednotlivých regionech ČR. Do aktualizace těchto dat nelze určit, zda obec Dukovany bude spadat mezi podpořené regiony, nicméně ve výzvě vyhlášené v roce 2025 tomu tak nebylo. Z výše uvedeného vyplývá, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nemůže garantovat finanční podporu pro zřízení dětských skupin, ale pouze pro jejich provoz. Vyčlenění finanční podpory z jiných zdrojů (stanovení těchto zdrojů a jejich výše dle zajištění požadovaných kapacit), bude tedy pro splnění opatření nezbytné. MPSV zajišťuje metodickou podporu, ÚP oprávnění (v případě splnění podmínek), vyplácení státního příspěvku (dle podmínek zákona) a kontrolu (včetně metodické podpory).		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo práce a sociálních věcí		
Spolupráce	Úřad práce České republiky Dotčené obce Společenství obcí Elektrárna Dukovany II, a. s. Zaměstnavatelé		
Termín	01/2026	12/2036	
Výstupy	• Zajištění souladu s legislativním rámcem a cílenou podporou • Navýšení kapacit péče o děti v dotčeném území (podpora financování provozu ze státního rozpočtu, případně dalších zdrojů) • Nově zřízené nebo rozšířené dětské skupiny (poskytovatel může být zaměstnavatel, NNO, územní samosprávný celek apod., (není nezbytné vytvářet zvláštní opatření)		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Mapování potřeb a lokalit s rizikem nedostatku předškolní péče	MPSV ve spolupráci s ÚP, kraji a obcemi	12/2026
	Navržení a projednání účelového posílení programu podpory dětských skupin v dotčeném území	MPSV	07/2027
	Podpora vzniku nových dětských skupin ve spolupráci s Úřadem práce České republiky, obcemi a zaměstnavateli	MPSV, ÚP, zaměstnavatelé, obce	od 01/2029
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad rozpočtu na program bude upřesněn dle rozhodnutí vlády k finančním zdrojům (MPSV nedisponuje žádnými zdroji na zřízení dětských skupin, pouze na provoz). Předpoklad cca 150–200 míst v dětských skupinách.		



29. Posílení personálních kapacit orgánu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s dostavbou EDU			
Zdůvodnění relevance	V souvislosti s dostavbou EDU se předpokládá příliv obyvatel, nárůst počtu osob provádějící dostavu (zejména cizinců), nová pracoviště, navýšení počtu zaměstnanců EDU, zvýšení počet osob v ubytovacích zařízeních, výstavby dočasných ubytoven atd. To vše přináší zvýšení rizika pro veřejné zdraví.		
	K rizikovým faktorům patří vyšší koncentrace osob v hromadných ubytovacích a stravovacích zařízeních, jazykové a kulturní bariéry znesnadňující komunikaci zdravotních rizik a omezený přístup části pracovníků k preventivní péči.		
	Dalším významným aspektem je ubytování osob s rozdílnými a často nižšími hygienickými návyky v dočasných ubytovnách, což může vést ke vzniku ohnisek alimentárních či respiračních infekcí a podpořit rychlejší šíření nemocí v komunitě.		
	Vzhledem k výše uvedenému je nezbytné zajistit posílení početních stavů pracovníků Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále „KHS Vysočina“).		
Zodpovědnost / garant	KHS Vysočina		
Spolupráce	Ministerstvo zdravotnictví		
Termín	01/2027	12/2038	
Výstupy	• Personální navýšení KHS Vysočina		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Navýšení systemizovaných míst na KHS Vysočina	Ministerstvo zdravotnictví, KHS Vysočina	01/2027
	Zajištění financování a personální obsazení HS	KHS Vysočina	od 12/2027
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Počet systemizovaných pozic na KHS Vysočina • Odbor protiepidemický – 4 pozice • Odbor hygieny práce – 2 pozice Celkový odhad ročních nákladů na nová místa na KHS: 4,2 mil. Kč. Celkový odhad nákladů na dobu dostavby: 50,1 mil. Kč. (výše nákladů ve vztahuje k roku 2025, nezahrnuje valorizaci platů). Počty vycházejí ze současných předpokladů, je možné, že vzhledem k vývoji bude nutné upravit počet nových služebních míst.		

4.1.7 Průřezové oblasti

30. Komunikační strategie a koncepce jednotného informačního místa a její uplatňování	
Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU je jednou z největších strategických investic státu s významnými ekonomickými, sociálními i environmentálními dopady na území Jihomoravského kraje. Studie provedená



	v rámci přípravy akčního plánu identifikovala zásadní potřebu zlepšit koordinaci, transparentnost a věcnou srozumitelnost komunikace státu, investora i dalších aktérů směrem k území a veřejnosti. Předmětem opatření je v souladu s usnesením vlády ČR č. 29 ze dne 15. ledna 2024 vytvoření komunikační strategie a koncepce jednotného informačního místa a zajištění jejího dlouhodobého uplatňování po celou dobu přípravy a realizace dostavby EDU. Cílem je zajistit otevřenou a srozumitelnou komunikaci, předcházet dezinformacím a posilovat důvěru obyvatel v projekt i v zapojené instituce.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo průmyslu a obchodu		
Spolupráce	Ministerstvo pro místní rozvoj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Elektrárna Dukovany II, a. s.		
Termín	09/2025	12/2038	
Výstupy	• Komunikační strategie dopadů dostavby Jaderné elektrárny Dukovany do roku 2030 (dále také „Komunikační strategie“) • Zřízené jednotné informační místo • Dlouhodobá, koordinovaná a transparentní komunikace vůči cílovým skupinám • Pravidelné informační kampaně, monitoring a evaluace		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Vzetí na vědomí Komunikační strategie vládou ČR, její rozpracování a implementace	MMR, MPO, JMK, Kraj Vysočina	od 09/2025
	Zajištění jednotné komunikace v souladu s Komunikační strategií a marketingovými plány	MPO, MMR	od 09/2025
	Průběžná aktualizace Komunikační strategie dle vývoje dostavby EDU a zpětné vazby	MPO, MMR	Průběžně
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad rozpočtu na uplatňování Komunikační strategie 5 mil. Kč ročně, na celé období cca 60 mil. Kč.		

31. Ověření finančních ztrát na příjmech dotčených obcí způsobených dočasným pobytem osob a poskytnutí odpovídající kompenzace

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU bude v dotčeném území znamenat až 3 500 osob bez trvalého pobytu v nejintenzivnějším období výstavby, přičemž podstatná část tohoto počtu bude pravděpodobně soustředěna do ubytoven, případně speciálních ubytovacích lokalit v blízkosti dostavby. Tyto osoby zde nebudou mít trvalý pobyt a dotčené obce z nich nebudou mít příjmy z rozpočtového určení daní (RUD), přičemž ale budou jejich přítomností výrazně zasaženy (bezpečnost, veřejná a technická infrastruktura). Obce nemohou tuto zátěž nést z vlastního rozpočtu na úkor příjmů plynoucích ze standardního příjmů z RUD. Poplatek z pobytu dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je neefektivní nástroj
-----------------------------	--



	pro kompenzaci těchto výpadků, a to jak z důvodu legislativního vymezení, tak z praktických problémů při jeho výběru. Studie dopadů uvádí, že kumulovaná ztráta obcí v dotčeném území souvislosti s osobami v dočasném pobytu může v období dostavby přesáhnout 350 milionů Kč. S ohledem na tyto skutečnosti, jakmile budou známy konkrétní ubytovací lokality a počty ubytovaných osob je vhodné provést ověření těchto finančních ztrát a s tím souvisejících negativních externalit. Pokud bude tato ztráta na základě analýzy skutečně prokázána, je vhodným řešením vytvoření dotačního programu, který bude prokazatelné negativní externality kompenzovat a doplní tak další opatření realizovaná společností Elektrárna Dukovany II, a. s., případně realizace programu ekonomické migrace upraveného pro účely dostavby EDU, který bude vhodně řešit negativní externality spojené s přítomností osob ze třetích zemí.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo financí		
Spolupráce	Ministerstvo vnitra Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Dotčené obce Svazky obcí Společenství obcí Elektrárna Dukovany II, a. s.		
Termín	01/2026	12/2036	
Výstupy	• Ověření finančních ztrát konkrétních obcí v souvislosti s ubytovacími lokalitami v dočasném pobytu • Implementace vhodného řešení pro vyrovnání ztrát pro dotčené obce		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Analýza ověření nároků a výběr nebo vytvoření vhodného mechanismu kompenzace	MMR, MV, MF, MPSV, EDU II	12/2026
	Implementace kompenzačního mechanismu	MF, MMR, MPSV, EDU II	01/2027
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Bude upřesněno na základě analýzy. Do výše prokázaných finančních ztrát.		

32. Analýza možností aktualizace metodických materiálů k agendě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, s ohledem na rozvojové potřeby obcí v okolí EDU

Zdůvodnění relevance	Stávající právní rámec, zejména zákon č. 334/1992 Sb., ochrana zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, reguluje možnosti realizace územních rozvojových záměrů, jako je výstavba ubytovacích zařízení, bytová výstavba včetně rodinných domů, související technická infrastruktura, objekty občanské vybavenosti (včetně sportovní, kulturní a volnočasové infrastruktury) a navazující dopravní stavby, například cyklostezky. Tato regulace se výrazně uplatňuje zejména
-----------------------------	--



	v případech, kdy se záměr týká půd zařazených do I. nebo II. třídy ochrany podle kódu BPEJ. Bez možnosti rozšířit zastavitelné plochy hrozí v dotčených obcích stagnace nebo úbytek obyvatelstva, čímž se obec připravuje o příležitost využít potenciální přínosy spojené s rozvojem území. S ohledem na uvedené se jeví jako vhodné vyhodnotit a případně aktualizovat stávající metodické materiály, aby dotčené orgány mohly jednotlivé záměry posuzovat v širších souvislostech. Zároveň je třeba usilovat o sjednocení postupu při výkonu státní správy v této oblasti.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo životního prostředí		
Spolupráce	Ministerstvo zemědělství Dotčené obce		
Termín	01/2026	09/2026	
Výstupy	Právní a věcná analýza možností úpravy metodických materiálu k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	1. Sběr dat a vstupů od obcí a krajů (využití aplikace Limity půdy)	MŽP, MZe, dotčené obce	2/2026
	2. Právní analýza	MŽP	09/2026
	3. Závěrečná zpráva a doporučení	MŽP, MZe	12/2026
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Spolupráce obcí. Přístup k datům ÚP/ZPF. Odhad rozpočtu: cca 0,8 – 1,0 mil. Kč.		

33. Analýza dopadů surovinové politiky v území dotčeném dostavbou EDU a její implementace

Zdůvodnění relevance	V dotčeném území bylo zjištěno, že existují potenciální ložiska surovin, které mohou být využita jak pro dostavbu EDU, tak i pro jiné účely, např. další významné souběžně probíhající stavby čerpajících surovinové zdroje (např. výstavba vysokorychlostní tratě a jiných silničních staveb). V souvislosti se současnými aktivitami MPO pro zajištění surovinové nebo energetické bezpečnosti státu nebo pro uskutečnění výstavby strategicky významné infrastruktury existuje možnost otevření nových těžebních lokalit v území, které bude dostavbou EDU zatíženo. Tyto oblasti nemusí být územně ani infrastrukturně připraveny na další zátěž spojenou s těžbou. Kumulace dopadů (stavební, provozní, environmentální i sociální) může zásadně zhoršit kvalitu života obyvatel a podmínky pro udržitelný rozvoj dotčeného území. Včasná identifikace ohrožených území a koordinace územního plánování je proto klíčová pro prevenci dalších negativních vlivů, které mohou nastat zejména ve spojitosti s dostavbou.
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo průmyslu a obchodu
Spolupráce	Ministerstvo životního prostředí Česká geologická služba Kraj Vysočina



	Jihomoravský kraj Dotčené obce		
Termín	01/2026	12/2030	
Výstupy	- Analýza obsahující přehled lokalit s potenciálním těžebním zájmem jak pro EDU, tak pro další významné souběžně probíhající stavby čerpajících surovinové zdroje (např. vysokorychlostní trať, výstavba silničních staveb aj.) - Návrh preventivních územně-plánovacích a regulačních opatření - Realizovaná opatření ve spolupráci s obcemi a kraji		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Analýza aktualizované surovinové politiky a identifikace dotčených lokalit	MPO, ČGS	06/2026
	Vyhodnocení územní připravenosti a kapacity dotčených obcí	MMR, kraje, obce	03/2026
	Návrh preventivních územně-plánovacích a regulačních opatření a jejich realizace	MMR, kraje, obce	do12/2035
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Přístup k aktuálním datům o záměrech těžby a územním plánování. Aktivní spolupráce dotčených ministerstev, krajů a obcí.		

34. Využití nového institutu společenství obcí jako nástroje pro řešení dopadů spojených s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU přináší výrazné dopady na vybrané obce, které významně přesáhnou možnosti jejich řešení ze strany zejména menších obcí. Nově zavedený institut společenství obcí zaměřený na rozvoj funkčních mikroregionů, upravený v § 53a a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje obcím strategicky spolupracovat v širším územním kontextu (budování a provoz infrastruktury, veřejné služby, místní/regionální rozvoj), a dále sdílet zaměstnance, zajišťovat společné služby a realizovat projekty s přesahem místní působnosti. Agendu společenství obcí, která je součástí vedení rejstříku svazku obcí, mají v gesci kraje. V podmínkách dotčeného území může být tento nástroj využit například k realizaci společných strategických rozvojových aktivit – investičních projektů, ke zřízení společné obecní policie, ke sdílení odborných kapacit úřadů, koordinaci dopravní obslužnosti, řešení dostupnosti vzdělávání nebo společnému čerpání dotací. Společenství obcí by měla být primárními nositeli územních rozvojových a koordinačních aktivit v souvislosti s dostavbou EDU. Měla by být koordinátory budování a organizace občanské vybavenosti či technické a dopravní infrastruktury pro celé dopadové území tak, aby byla zajištěna efektivní distribuce výkonu budoucích veřejných služeb. Společenství obcí by měla být hlavním příjemcem dotačních prostředků určených k rozvoji dotčených mikroregionů a ke kompenzaci vyvolaných nákladů.
-----------------------------	---



	Společenství obcí je také vhodnou platformou pro jednotné vystupování vůči investorovi, státu a kraji. Jeho využití pro vybrané obce dotčeného území může přinést zvládnutí negativních dopadů investice a posílení soudržnosti území.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo vnitra		
Spolupráce	Dotčené obce a jejich svazky Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Ministerstvo pro místní rozvoj		
Termín	01/2026	12/2038	
Výstupy	• Strategická koordinace rozvoje území ze strany společenství obcí v dotčeném území • Konkrétní společné projekty realizované společenstvími obcí • Využívání již existujícího dotačního titulu zaměřeného na společenství obcí – rozvoj, kompenzace.		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Zajištění informovanosti obcí a poskytování metodické podpory o možnostech využití institutu společenství obcí	MV	Průběžně
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Bez nároku na státní rozpočet z titulu akčního plánu.		

35. Zlepšení dostupnosti vysokorychlostního internetu a mobilního signálu v území dotčeném dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Ve vybraných oblastech dotčeného území dostavby EDU, zejména v Kraji Vysočina, přetrvává nízká penetrace vysokorychlostního internetu a nedostatečné pokrytí mobilním signálem, což omezuje každodenní fungování obyvatel, institucí, podnikatelů. Tato situace významně snižuje kvalitu života a představuje bariéru pro další rozvoj území, především v oblastech digitalizace, vzdělávání, zdravotní péče a chytré infrastruktury. Současně může být problém při zvládání krizových situací. Vzhledem k charakteru území a jeho nízké atraktivitě z pohledu návratnosti investic zde dochází k tržnímu selhání – soukromí poskytovatelé zde nejsou motivováni investovat do nákladné infrastruktury bez veřejné podpory. V kontextu plánované dostavby EDU, která přinese zvýšené nároky na řízení, bezpečnost, mobilitu pracovní síly a další infrastrukturu, je zajištění digitální konektivity nezbytným předpokladem pro úspěšné zvládnutí transformačních dopadů dostavby EDU Ministerstvo průmyslu a obchodu může řešit situaci podporou výstavby VHCN sítí z fondů EU, ve spolupráci s ČTÚ při identifikaci oblastí s tržním selháním a případně též s využitím notifikovaných podpor. Důležitá je také koordinace investic v rámci digitálního Česka a využití strategie Connectivity Toolbox.		
Zodpovědnost / garant	Ministerstvo průmyslu a obchodu		
Spolupráce	Český telekomunikační úřad Ministerstvo pro místní rozvoj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj		

	Provozovatelé sítí elektronických komunikací a poskytovatelé služeb elektronických komunikací		
Termín	01/2026	12/2034	
Výstupy	• Zajištěné pokrytí vysokorychlostním internetem v identifikovaných lokalitách • Zlepšená dostupnost mobilního signálu (včetně 4G/5G) • Vytvořené podmínky pro digitální veřejné služby, rozvoj podnikání a možnosti řešení krizových situací		
Plánované aktivity	Popis	Dílčí zodpovědnost	Indikativní termín
	Mapování pokrytí a identifikace bílých míst (data k 31. 12. 2025)	MPO, ČTÚ, kraje	do 12/2026
	Využití stávajících a připravovaných programů	MPO	01/2027
	Realizace projektů	Operátoři, obce	
Podmínky realizace (rozpočet, zdroj financování atd.)	Odhad rozpočtu na programy bude upřesněn v závislosti na výsledcích mapování a nastavení programového období 2028-2034.		

4.2 Doporučení pro dotčené území

Dostavba EDU představuje komplexní změny s různorodými dopady na dotčené území, především na úrovni krajů a obcí. Efektivní řízení těchto dopadů vyžaduje koordinovanou spolupráci všech zainteresovaných aktérů, promyšlené plánování a cílené využití dostupných nástrojů a zdrojů. Následující doporučení jsou zaměřena na podporu komunikace, finančního zajištění a přípravy území tak, aby bylo možné minimalizovat negativní dopady a současně využít vzniklé příležitosti v souvislosti s dostavbou EDU.

a) Spolupráce na implementaci Komunikační strategie dostavby EDU	
Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU představuje strategický projekt s významnými dopady v dotčeném území. Z komunikační strategie vyplývá, že je nutné zajistit koordinovanou, srozumitelnou a důvěryhodnou komunikaci směrem k zainteresovaným stranám. Komunikační strategie a koncepce jednotného informačního místa dostavby EDU byla vytvořena jako součást přípravných dokumentů projektu.
Doporučení pro dotčené území	Kraji Vysočina a Jihomoravskému kraji se doporučuje aktivně s Ministerstvem pro místní rozvoj jako gestorem strategie spolupracovat na její implementaci, včetně zajištění regionálních komunikačních kanálů a zapojení místních aktérů.
Termín	2025–2038
Poskytnutá součinnost	• Členství v řídicím výboru zajišťující implementaci komunikační strategie • Jednotné řízení komunikace, společné komunikační kanály, sjednocování komunikačních sdělení a informací
Očekávané výstupy	• Implementovaná komunikační strategie na regionální úrovni • Funkční systém regionálních komunikačních kanálů • Jednotná a důvěryhodná komunikace směrem k obyvatelům, obcím a dalším stakeholderům



b) Vytvoření finančního nástroje pro spolufinancování poskytnutých kompenzací státu na úrovni krajů	
Zdůvodnění relevance	Finanční kompenzace poskytované státem nebudou pokrývat veškeré potřeby území v souvislosti s dostavbou EDU. Míra kompenzací bude navíc závislá na typu realizovaných aktivit – zatímco opatření zmírňující přímé dopady mohou být plně kompenzovány, projekty s částečným dopadem nebo projekty rozvojového charakteru budou vyžadovat aktivní spolufinancování ze strany dotčených krajů a obcí. Vytvoření vlastního nebo využití již existujícího finančního nástroje v gesci kraje umožní efektivně využít národní prostředky na potřeby území, zejména na spolufinancování rozvojových projektů, které nejsou plně kryty státními kompenzacemi, a zajistí lepší sladění investic s krajskými strategickými prioritami.
Doporučení pro dotčené území	Kraji Vysočina a Jihomoravskému kraji se doporučuje vytvořit vlastní finanční nástroj, které bude sloužit ke spolufinancování poskytnutých kompenzací ze strany státu a pro řešení vlastních priorit v souvislosti s dostavbou EDU
Termín	2026–2038
Poskytnutá součinnost	• Účelové finanční prostředky na řešení dopadů pro kraje • Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími resorty při implementaci systému kompenzací • Koordinace s krajskými programy rozvoje a rozpočtovou politikou
Očekávané výstupy	• Vytvořený a funkční finanční nástroj na úrovni kraje • Transparentní systém spolufinancování rozvojových opatření

c) Připravenost obcí v dotčeném území	
Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU přinese obcím v dotčeném území různé dopady, které je třeba na úrovni jednotlivých obcí pečlivě vyhodnocovat. Zodpovědné plánování a posuzování těchto dopadů umožní obcím identifikovat potřeby a vhodně doplnit rozvojové aktivity související s dostavbou EDU. Efektivní koordinace a komunikace mezi dotčenými obcemi krajem zajistí, že se opatření mohou realizovat dle potřeb jednotlivých obcí a opatření uplatňovaná na národní úrovni budou pro obce efektivním řešením negativních dopadů a současně jim umožní využití příležitosti spojené s dostavbou EDU.
Doporučení pro dotčené území	Obce v dotčeném území by měly aktivně vyhodnocovat dopady dostavby EDU na své území a podle toho plánovat a připravovat konkrétní projekty, které budou řešit identifikované problémy i využívat příležitosti. Tyto projekty musí odpovídat kapacitám obce v plánování a přípravě a zároveň je nezbytné, aby obce své potřeby efektivně komunikovaly krajům a státním institucím, aby mohly získat potřebnou podporu a financování.
Termín	2026–2038
Poskytnutá součinnost	• Účelové finanční prostředky na řešení dopadů pro obce • Komplexní podpora ze strany státních institucí dotčenému území dle opatření akčního plánu
Očekávané výstupy	• Připravené projekty reagující na dopady dostavby EDU.



	• Spolufinancování pro řešení rozvojových projektů v dotčených obcích.
--	--

d) Využití nového institutu společenství obcí jako nástroje pro řešení dopadů spojených s dostavbou EDU

Zdůvodnění relevance	Dostavba EDU přináší výrazné dopady na vybrané obce, které významně přesáhnout možnosti jejich řešení ze strany zejména menších obcí. Nově zavedený institut společenství obcí, upravený v § 46a–§ 49 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje obcím formálně spolupracovat, sdílet zaměstnance, zajišťovat společné služby a realizovat projekty s přesahem místní působnosti. Spolupráce v rámci společenství obcí je vhodným řešením pro řešení dopadů dostavby EDU.
Doporučení pro dotčené území	Obcím se doporučuje aktivně zvážit založení nebo vstup do společenství obcí v dotčeném území dostavby EDU za účelem efektivní koordinace a sdílení kapacit při řešení dopadů spojených s dostavbou EDU. Tento institut umožňuje zřizovat společné služby (např. obecní policii), sdílet technické a administrativní kapacity úřadů, a vystupovat jednotně vůči státu i investorovi. Spolupráce ve společenství také posiluje vyjednávací pozici a zvyšuje šance na získání podpory z veřejných zdrojů. Společenství obcí jsou registrována v Rejstříku svazků obcí, který vedou krajské úřady. Krajské úřady poskytují ke zřizování svazku obcí poradenství.
Termín	2025-2038
Poskytnutá součinnost	Ministerstvo vnitra a kraje poskytnou obcím prostřednictvím svých ambasadorů v území informace a metodickou podporou o možnostech využití institutu společenství obcí
Očekávané výstupy	Nová funkční společenství obcí v dotčeném území.

5 Implementační rámec

Implementační rámec představuje soubor pravidel pro řízení procesu implementace opatření reagujících na dopady dostavby EDU v dotčeném území. Zajišťuje koordinovaný a jednotný postup mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy, správci programových nástrojů, územními a dalšími relevantními aktéry. Stanovuje odpovědnosti, procesní nastavení a systém vyhodnocování realizovaných kroků.

Cílem implementačního rámce je umožnit efektivní, transparentní a předvídatelné naplňování akčního plánu na národní úrovni, a to prostřednictvím stabilní organizační struktury, jasně definovaných kompetencí a vzájemné otevřené komunikace všech dotčených aktérů.

5.1 Organizační a řídicí struktura

Ministerstvo pro místní rozvoj plní koordinační roli na národní úrovni v oblasti řešení dopadů dostavby EDU.

Za účelem mezíresortní spolupráce při realizaci akčního plánu je vytvořena **Mezíresortní pracovní skupina Dukovany**, která je klíčovou platformou pro koordinaci, vyhodnocování a řízení opatření napříč jednotlivými resorty. Tato pracovní skupina zajišťuje jednotný postup státu při řešení dopadů dostavby EDU a naplňování akčního plánu. Její působnost je stanovena na období dostavby EDU, respektive úkolů vyplývajících z akčního plánu.

Složení Meziresortní pracovní skupiny Dukovany:

- Ministerstvo pro místní rozvoj – koordinační role
- Ministerstvo vnitra
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Ministerstvo dopravy
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- Ministerstvo obrany
- Ministerstvo financí
- Ministerstvo zemědělství
- Ministerstvo životního prostředí
- Ministerstvo zahraničních věcí

Zástupci dotčených krajů, tj. Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje jsou stálými členy Meziresortní pracovní skupiny Dukovany, a to za účelem zajištění účinného obousměrného přenosu relevantních informací mezi národní a regionální úrovní. Jejich zapojení podporuje provázanost rozhodovacích procesů, přispívá k efektivnímu řízení implementace a umožňuje včasné sdílení zpětných vazeb na realizovaná opatření z území.

5.2 Proces implementace

Součástí procesu implementace je zajištění pravidelného vyhodnocování a pružné reakce na aktuální potřeby v území.

Klíčovými nástroji implementace akčního plánu jsou

- **Zpráva o plnění akčního plánu** – představuje souhrnné vyhodnocení realizace opatření a aktivit za uplynulé období. Obsahuje přehled dosažených výstupů, identifikaci problémových oblastí a zpětnou vazbu od zapojených aktérů.



- **Aktualizace akčního plánu** – je návrhem na úpravu, doplnění nebo přeformulování opatření. Vychází zejména ze zjištění uvedených ve Zprávě o plnění akčního plánu, ale může zohledňovat také jiné závažné okolnosti, nové zdůvodněné potřeby v území a další podněty ze strany dotčených subjektů.

Zpráva o plnění akčního plánu se vypracovává za uplynulý kalendářní rok realizace akčního plánu. Zpráva se předkládá vládě ČR, a to do 31. března následujícího roku. První zpráva bude vypracována za r. 2026 (vládě ČR bude předložena v březnu r. 2027). Zprávu vypracovává Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s aktéry definovanými v bodě 5.1 akčního plánu.

Pokud se kdykoli během implementace akčního plánu ukáže, že je třeba jej upravit, doplnit nová opatření či upravit opatření stávající, vypracuje se aktualizace akčního plánu, která předmětné změny blíže popíše a odůvodní. Stejně jako akční plán musí být každá aktualizace akčního plánu schválena vládou ČR.

5.3 Řízení rizik

Efektivní implementace akčního plánu předpokládá včasnou identifikaci a řízení rizik, která mohou negativně ovlivnit naplňování stanovených opatření, spolupráci se zapojenými aktéry či celkový dopad v dotčeném území. Řízení rizik je nedílnou součástí řízení celého procesu a je koordinováno Ministerstvem pro místní rozvoj společně s aktéry definovanými v bodě 5.1. akčního plánu.

Hlavní rizika:

- **Změny v národních prioritách** – odklon státní politiky od podpory řešení dopadů dostavby EDU může snížit relevanci nebo podporu jednotlivých opatření.
- **Změny legislativního rámce** – nové zákony nebo úpravy předpisů mohou zkomplikovat či zpomalit realizaci vybraných opatření.
- **Neposkytnutí nebo podstatné snížení finančních prostředků** – ohrožení financování plánovaných projektů a opatření.
- **Nedostatečná míra zapojení klíčových aktérů a komunikační bariéry** – oslabení spolupráce mezi dotčenými resorty, kraji, obcemi a dalšími subjekty může vést ke ztrátě podpory v území.
- **Omezené personální kapacity** – nedostatek odborného nebo provozního zajištění pro realizaci opatření v akčním plánu.
- **Zpoždění ve schvalovacích a koordinačních procesech** – může vést ke zpoždění v realizaci a ztrátě návaznosti mezi opatřeními.
- **Nejednotná politická podpora** – může oslabit věcný přístup k řešení dopadů dostavby EDU, vést k nestabilní podpoře napříč aktéry a ztížit naplňování akčního plánu.

Rizika jsou průběžně vyhodnocována. Informace o vyhodnocení rizik je součástí **Zprávy o plnění akčního plánu**.

5.4 Financování

Financování řešení dopadů dostavby EDU vyžaduje vícezdrojový přístup. Primární odpovědnost za kompenzaci prokazatelných negativních dopadů výstavby na dotčené území nese stát jako klíčový investor tohoto strategického projektu. Součástí soustředěné podpory státu je nejen finanční náhrada za negativní dopady dostavby EDU na území, ale rovněž vytvoření podmínek pro to, aby dotčená území mohla využít potenciální přínosy projektu pro svůj další rozvoj.

Na financování opatření se zároveň podílejí i kraje a obce, a to v rozsahu odpovídajícím jejich kompetencím a finančním možnostem. Tento princip zajišťuje spravedlivé a realistické rozdělení závazků mezi jednotlivé úrovně veřejné správy.

Stát zajistí systémové, dlouhodobě udržitelné financování, které odpovídá rozsahu a závažnosti dopadů dostavby EDU. Zároveň zřídí účelově vázané nástroje náhrad za negativní dopady dostavby EDU na území, přičemž fungování těchto nástrojů bude založeno na předvídatelných a transparentních pravidlech čerpání.

Veškeré prostředky budou směřovány výhradně do oblastí, které přímo reagují na negativní dopady dostavby EDU na území, jak jsou identifikovány ve studii a dalších relevantních dokumentech. Nebude podporováno řešení běžných nebo dlouhodobě existujících problémů, které s výstavbou nesouvisí.

Důraz bude kladen na:

- jasné vymezení oprávněných nákladů,
- efektivní kontrolu vynakládání veřejných prostředků,
- a transparentní reporting o využití financí.

Tento přístup zajistí, že náhrady za negativní dopady budou odpovídat skutečnému dopadu dostavby EDU na území a přispějí ke stabilizaci a rozvoji dotčeného území.

5.4.1 Rozpočtové náklady


V souladu s praxí u velkých infrastrukturních projektů, zejména v oblasti jaderné energetiky, se **běžné vyčleňuje 2–5 %** předpokládané investice na řešení socioekonomických dopadů výstavby. Tyto prostředky jsou určeny na kompenzace obcím, rozvoj veřejné infrastruktury, posílení bezpečnostních a krizových mechanismů a na opatření podporující sociální soudržnost v dotčeném území. OECD Nuclear Energy Agency (NEA) doporučuje začlenění těchto kompenzačních mechanismů jako klíčový prvek pro zajištění dlouhodobé společenské akceptace projektu. Informace k dopadům obdobných projektů a využití kompenzačních mechanismů jsou uvedeny ve studii.

Na základě prvotního sběru a vyhodnocení podnětů z území dotčeného dostavbou EDU byla provedena orientační kalkulace celkových nákladů na řešení identifikovaných dopadů. Tyto náklady jsou odhadovány ve výši přibližně **15 mld. Kč v současných cenách**, což představuje **cca 3,75 % nákladů investice**. Tato částka byla stanovena pro celé období realizace akčního plánu, tj. období let 2026–2038, přičemž první výdaje státního rozpočtu se očekávají až v r. 2027. Aktivita související s Akčním plánem, které bude nutno realizovat již v r. 2026, budou financovány ze schválených výdajových limitů příslušné rozpočtové kapitoly pro rozpočtový rok 2026.

Současně vlivem inflace a případně jiných vlivů se může výše zmiňovaná částka v průběhu doby plnění akčního plánu měnit, resp. navýšit. Proto bude třeba průběžně vyhodnocovat plnění Akčního plánu a posuzovat nejen uskutečněné projekty, ale i ty, které budou plánovány.

Výdaje na financování dopadů se budou vyvíjet v závislosti na pokročilosti samotné stavby a tím vznikající potřebě nových pracovníků a příchodu dalších nových osob do dotčeného regionu. Nejvyšší nárůst výdajů je očekáván v letech 2027-2032.

Graf 1: Vývoj finanční potřeby v letech

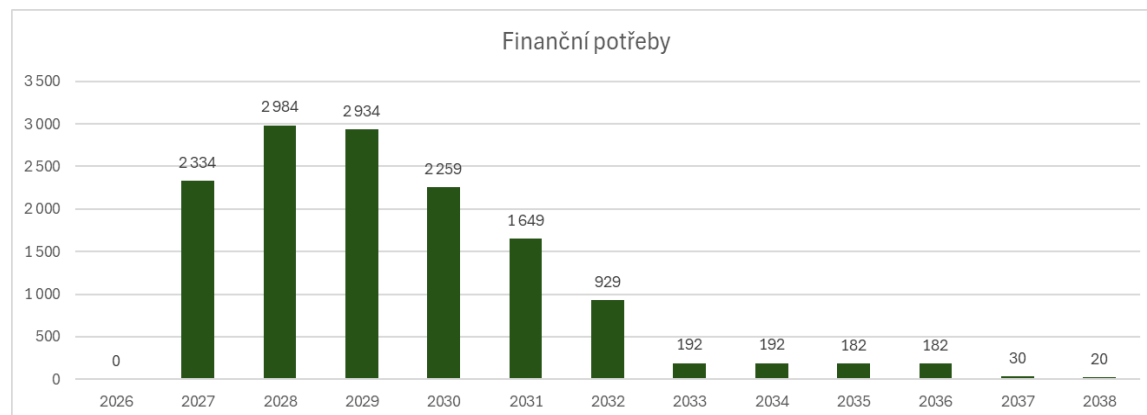

S ohledem na rozsah a povahu těchto dopadů je nezbytné, aby se na jejich řešení podílely všechny úrovně veřejné správy. Navržený model financování vychází z principu sdílené odpovědnosti, přičemž zohledňuje jak strategický charakter projektu pro stát, tak reálné fiskální možnosti jednotlivých úrovní veřejné správy.

Tabulka 2: Podíl veřejné správy na financování akčního plánu

Úroveň veřejné správy	Předpokládaný podíl	Předpokládaný finanční rámec	Podíl nákladů na investici
Stát	80 %	12 mld. Kč	3 %
Dotčené kraje	10 %	1,5 mld. Kč	0,375 %
Dotčené obce a jejich sdružení	10 %	1,5 mld. Kč	0,375 %
Celkem	100 %	15 mld. Kč	3,75 %

Studie prokázala, že samotná investice do dostavby EDU vykazuje silný multiplikační efekt s vysokou mírou návratnosti pro českou ekonomiku. Výše náhrad za negativní dopady dostavby EDU na území proto nepředstavuje pouhý náklad, ale klíčový nástroj k plnému využití tohoto potenciálu. Přispívá nejen k aktivaci místní ekonomiky, ale také k řešení dlouhodobých strukturálních problémů daného území.

5.4.2 Způsob provádění a financování akčního plánu

Opatření akčního plánu budou prováděna jednotlivými ministerstvy označenými jako tzv. garant v kartě opatření. Opatření budou financována z kapitol příslušných ministerstev. Ministerstva budou provádět kalkulaci výdajů na nadcházející kalendářní rok a při přípravě státního rozpočtu zahrnou požadovanou částku na úhradu výdajů do svých požadavků na daný rok. Prostředky na realizaci akčního plánu budou ministerstvům poskytnuty navýšením příslušné kapitoly o požadované výdaje.

Část opatření bude realizována navýšením prostředků na platy zaměstnanců ve služebním poměru a změnou systemizace nebo navýšením provozních výdajů na realizaci analýzy či vytvoření programu, část opatření bude realizována s využitím existujícího programu podpory nebo vytvořením programu nového.

Míra podpory

Míra podpory ze strany státu nemůže být pro všechna opatření akčního plánu stejná, ale měla by se lišit dle typu podpory a oblasti, do které podpora směřuje, a to v rozsahu 60–100 %. Míra podpory se bude lišit také v závislosti na potřebě řešení dopadů v dotčeném území, a to rovněž na úrovni jednotlivých opatření. V souladu s principem územní dimenze bude při alokaci finančních prostředků zohledněna intenzita negativních dopadů dostavby EDU v jednotlivých lokalitách. Podpora tak bude diferencována s ohledem na specifické potřeby území, která vyplývají z různé míry zátěže způsobené realizací projektu.

Tabulka 3: Míra podpory jednotlivých opatření akčního plánu ze strany státu

% podpory ze SR	Povaha územního dopadu	Příklady opatření
100 %	Přímé, nevyhnutelné dopady dostavby EDU se zásadními důsledky	1. Posílení personálních kapacit Hasičského záchranného sboru; 2. Posílení personálních kapacit Policie ČR; 4. Kapacitní posílení regionálních pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra; 5. Posílení kapacit center na podporu integrace cizinců; 19. Posílení aktivní politiky zaměstnanosti; 20. Posílení kontrolní kapacity v oblasti inspekce práce; 21. Vytvoření vládního programu na podporu vysokých škol v oblasti jaderné energetiky a souvisejících oborů; 25. Ověření připravenosti nemocnic v území; 29. Komunikační strategie a koncepce jednotného informačního místa a její uplatňování; 32. Analýza možností aktualizace metodických materiálů k agendě zákona č. 334/1992 Sb., s ohledem na rozvojové potřeby obcí v okolí EDU
80 %	Přímé dopady s negativními důsledky dostavby EDU	3. Posílení infrastruktury a vybavení složek IZS; 6. Posílení krizové připravenosti území; 9. Podpora výstavby a rekonstrukce dostupného nájemního bydlení (ubytování pro personál, složky IZS); 15. Opatření na dopravní infrastrukturu obcí; 23. Rozvoj vzdělávací infrastruktury regionálního školství; 27. Rozvoj krajské zdravotní infrastruktury; 28. Podpora dostupné péče o děti
70 %	Měkká a plánovací opatření reagující na dopady dostavby EDU	11. Podpora projektové přípravy veřejných investic v území dotčeném dostavbou EDU
60 %	Rozvojová opatření se širším přínosem reagující na důsledky dostavby EDU	9. Podpora výstavby a rekonstrukce dostupného nájemního bydlení (nová populace); 10. Podpora výstavby a rozvoje vodohospodářské infrastruktury; 14. Posílení přenosové a distribuční soustavy; 16. Podpora rozvoje infrastruktury pro zlepšení dopravní obslužnosti; 18. Podpora vytvoření inovačního a investičního zázemí navázaného na dostavbu EDU; 22. Přizpůsobení regionálního vzdělávacího systému; 35. Zlepšení dostupnosti vysokorychlostního internetu a mobilního signálu

Akční plán naplňuje tyto principy:

- poskytuje náhradu za prokazatelné negativní dopady dostavby EDU, které by vedly ke zhoršení postavení dotčeného území oproti stavu před realizací dostavby EDU,
- financování programu je vícezdrojové, přičemž prostředky jsou zajištěny především ze státního rozpočtu, s doplňkovým zapojením krajů a dotčených obcí,
- není určen k řešení běžných potřeb území ani ke kompenzaci dopadů nesouvisejících s dostavbou EDU,
- umožňuje přiměřeně využít rozvojových příležitostí, které se pro dotčené území v souvislosti s dostavbou EDU otevírají,



- zohledňuje různou intenzitu dopadů v jednotlivých částech dotčeného území, a umožňuje tak cílené a spravedlivé nastavení podpory,
- dotčené území může být pro realizaci programu zpřesněno v souvislosti s novými skutečnostmi a skutečnými dopady dostavby EDU,
- na podporu z programu nevzniká právní nárok, o financování konkrétních projektů a přidělení prostředků rozhoduje hodnoticí a schvalovací proces dle pravidel programu,
- nevylučuje zapojení případných dalších disponibilních zdrojů (evropské fondy z období po roce 2028 apod.) do procesu kompenzací negativních dopadů dostavby EDU,
- je v souladu s pravidly veřejné podpory, včetně závazků plynoucích z právních předpisů České republiky a práva Evropské unie, zejména v oblasti podpory regionálního rozvoje, hospodářské soutěže a vyloučení neoprávněných zvýhodnění.



6 Přílohy

6.1 Přehled opatření

Číslo	Název	Gesce
1.	Posílení personálních kapacit Hasičského záchranného sboru v souvislosti s dostavbou EDU	MV
2.	Posílení personálních kapacit Policie ČR v souvislosti s dostavbou EDU	MV
3.	Posílení infrastruktury a vybavení složek IZS v souvislosti s dostavbou EDU	MV
4.	Kapacitní posílení regionálních pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra	MV
5.	Posílení kapacit center na podporu integrace cizinců v území dotčeném dostavbou EDU	MV
6.	Posílení krizové připravenosti území v souvislosti s dostavbou EDU	MV
7.	Vytvoření zvláštního vládního programu na podporu cílené ekonomické migrace pro účely dostavby EDU	MPO
8.	Podpora bezpečnosti a prevence kriminality v obcích v souvislosti s dostavbou EDU	MV
9.	Podpora výstavby a rekonstrukce dostupného nájemního bydlení v území dotčeném dostavbou EDU	MMR
10.	Podpora výstavby a rozvoje vodohospodářské infrastruktury	MZe, MŽP
11.	Podpora projektové přípravy veřejných investic v území dotčeném dostavbou EDU	MMR
12.	Konzultační a metodická podpora veřejných investic v souvislosti s dostavbou EDU	MMR
13.	Posílení výkonu státní správy ve vybraných správních činnostech na úseku stavebního řízení	MV
14.	Posílení přenosové a distribuční soustavy v území dotčeném dostavbou EDU	MPO
15.	Opatření na dopravní infrastrukturu obcí dotčených dostavbou EDU	MMR
16.	Podpora rozvoje infrastruktury pro zlepšení dopravní obslužnosti dostavby EDU	MMR
17.	Prevence objíždění návozdových tras a optimalizace dopravních proudů v souvislosti s dostavbou EDU	



Číslo	Název	Gesce
18.	Podpora vytvoření inovačního a investičního zázemí navázaného na dostavbu EDU	MPO
19.	Posílení aktivní politiky zaměstnanosti v souvislosti s dostavbou EDU	MPSV
20.	Posílení kontrolní kapacity v oblasti inspekce práce v souvislosti s dostavbou EDU	MPSV
21.	Vytvoření vládního programu na podporu vysokých škol v oblasti jaderné energetiky a souvisejících oborů	MŠMT
22.	Přizpůsobení regionálního vzdělávacího systému v souvislosti s dostavbou EDU	MŠMT
23.	Rozvoj vzdělávací infrastruktury regionálního školství v souvislosti s dostavbou EDU	
24.	Vyhodnocení systému přidělování státního příspěvku na krizovou připravenost zdravotnické záchranné služby kraje	MZdr
25.	Ověření připravenosti nemocnic v dotčeném území dostavby EDU	MZdr
26.	Podpora dostupnosti zdravotní péče v území dotčeném dostavbou EDU	MZdr
27.	Rozvoj krajské zdravotní infrastruktury v souvislosti s dostavbou EDU	MZdr
28.	Podpora dostupné péče o děti v souvislosti s dostavbou EDU	MPSV
29.	Posílení personálních kapacit orgánu ochrany veřejného zdraví v souvislosti s dostavbou EDU	MZdr
30.	Komunikační strategie a koncepce jednotného informačního místa a její uplatňování	MPO
31.	Ověření finančních ztrát na příjmech dotčených obcí způsobených dočasným pobytem osob a poskytnutí odpovídající kompenzace	MF
32.	Analýza možností aktualizace metodických materiálů k agendě zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, s ohledem na rozvojové potřeby obcí v okolí EDU	MŽP
33.	Analýza dopadů surovinové politiky v území dotčeném dostavbou EDU a její implementace	MPO
34.	Využití nového institutu společenství obcí jako nástroje pro řešení dopadů spojených s dostavbou EDU	MV
35.	Zlepšení dostupnosti vysokorychlostního internetu a mobilního signálu v území dotčeném dostavbou EDU	MPO



6.2 Seznam obrázků

Obrázek 1: Dotčené území pro účely vypracování studie	3
---	---

6.3 Seznam tabulek

Tabulka 1: Vzor karty opatření	7
Tabulka 2: Podíl veřejné správy na financování akčního plánu	50
Tabulka 3: Míra podpory jednotlivých opatření akčního plánu ze strany státu	51

6.4 Seznam grafů

Graf 1: Vývoj finanční potřeby v letech	50
---	----

6.5 Seznam zkratek

BMO	Brněnská metropolitní oblast
BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BPEJ	Bonitovaná půdně ekologická jednotka
CPIC	Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina
CRR	Centrum pro regionální rozvoj České republiky
ČGS	Česká geologická služba
ČOV	Čistírna odpadních vod
ČR	Česká republika
ČTÚ	Český telekomunikační úřad
DESÚ	Dopravní a energetický stavební úřad
DS	Dětská skupina
EDU	Jaderná elektrárna Dukovany
ESIF	Evropské strukturální a investiční fondy
FN	Fakultní nemocnice
HDP	Hrubý domácí produkt
HK	Hospodářská komora
HP	Havarijní plánování
HPH	Hrubá přidaná hodnota
HZS	Hasičský záchranný sbor
HS	Hasičská stanice
IROP	Integrovaný regionální operační program
IZS	Integrovaný záchranný systém
JIC	Jihomoravské inovační centrum
JINAG	Jihomoravská agentura pro veřejné inovace
JMK	Jihomoravský kraj
KŘP	Krajské ředitelství policie
KSÚSV	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
KÚ	Krajský úřad
KV	Kraj Vysočina
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MO	Ministerstvo obrany
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
MZdr	Ministerstvo zdravotnictví
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NJZ	Nový jaderný zdroj
NNO	Nezisková organizace
NSP	Národní soustava povolání
PS	Pracovní skupina
RUD	Rozpočtové určení daní
